

Setoran seperti ini adalah jang  
ke ..... diantar tahun 19.....

**SURAT TANDA  
SETORAN**

No. ....

Lembar ke .....

Setoran seperti ini jang teraschir, telah  
dilakukan pada tanggal .....

Perit. Indonesia 66/70

Kepala Kas Daerah

Kepala Kantorpos (pembantu) di

TAKINGON, -

harap menerima uang sebesar

Rp. 23.356,70

(dengan huruf) : =Duapuluh tigribu ser, tus limapuluh enam 70/100 rupiah=

untuk Uang Sumbangan Pembangunan Daerah (sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Da-  
erah Istimewa Atjeh No.4/1969 tgl. 29 Oktober 1969), atas borongan Pembangunan  
Kantor Kecamatan Bilih Nere 14 x Rp 2.315.670,-

Kepala Pembukuan

TAKINGON, tg. 14 M E I 1971

PENGORONG,

Uang tersebut diatas telah diterima

tg. .... 19.....

(TOK. ADJ. INALIL)

ATTEN TENGAH

TAKINGON

# TANDA PENERIMAAN

SUDAH TERIMA DARI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.-  
LIANG BANJAKNJA

=LIMARATUS TUDJUHPULOH DELAPAN RIBU SEMBILANRATUS TUDJUH-  
=BELAS KUPIAH LINDAPULUH SEMBILANRATUS--

J A I T U

Uang penbajaran termijn Ketiga dari harga borongan Pembangunan Kantor/rumah annex Tjamat Kepala Pemerintahan Kotjamatan Silih-Hara Angkup, (sesuai menurut surat perdjandjian borongan tanggal 25 Maret 1971 No.2/V-1971, ( 25% x Rp.2.315.670,-).-

*(Handwritten signature)*  
Pimpinan Proyek  
*(Handwritten signature)*  
(*Handwritten name*)

TAKENGON, 21 Agustus 1971.-

Jang menerima  
P.T. Perak. Dagang & Perindustrian  
"ATJEH TENGAH"

N a m a TAKENGON **TGK. ABD. DJALIL**  
Pekerdjiaan **Direktur P.T. Atjeh -**  
Alamat jang terang **Tengah TAKENGON.-**

Penbajaran disetujui  
BENDAHARAWAN

(*Handwritten signature*)

TERBILANG Rp. **578.917,50**  
Barang<sup>1</sup>/pekerdjaan<sup>2</sup> jang dimaksud telah di-  
terima/diseleenggarakan dengan sempurna  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_  
Pengurus Barang<sup>1</sup>/pekerdjaan

( \_\_\_\_\_ )

Nomor : 5074/V-1971.

Lampiran : 1 berken.  
Perihal : Laporan bulanan serta Prog-  
ress report atau pembangu-  
nan Kantor/ruang Annex Tjamat  
Kepala Pemerintahan Kotjamatan  
Silih Nara.-

K e p a d a :

GJEMBUH/AsPala Daerah  
PROVINSI DAERAH ESTIMA  
WA ATJAH

di

ASALWA ATJAH.

ASALWA'ALIA INOM W.W.

1. Dengan hormat, berlampiran dengan ini dikirimkan pada saudara laporan bulanan serta progress-report atau pembangunan Kantor/ruang Annex Tjamat Kepala Pemerintahan Kotjamatan Silih Nara, dimana bangunan tersebut telah hampir selesai dikerjakan oleh pemborong, oleh sebab mana kepada Pemborong tersebut, sesuai menurut progress-report terlampir telah dapat dilakikan pembajernnja untuk termijn ke III (tiga).
2. Selanjutnya mengenai laporan fisil foto dari bangunan tersebut, akan menjusul kemudian bersama-sama dengan progress-termijn ke IV (empat) atau teracir dan berite atjara serah terime antara Pemborong dengan kami setelah keseluruhan bangunannja selesai.
3. Demikian agar saudara maklum.



DI/AsPala Daerah Kabupaten  
ATJAH LANGKAH.

MURDIN SUKIR



PROGRES REPORT.

Tanggal :  
 Kuartal :  
 Nama Proyek : Pembangunan Kantor/rumah  
 Annex Tjapat Kepala Pame-  
 rintahan Setjap-tan Bilih  
 Nara di Angkup.  
 Propinsi : Propinsi Daerah Istimewa  
 Atjeh.  
 Terletak : di - Angkup .

A. LAPORAN TEKNIS :

No.	Bahagian Pekerjaan	Progres	Tjatat
1.	Penyelidikan portase	100	
2.	Penyelidikan lengkap	100	
3.	Banjana gab. (Design) Anggaran belanda	100	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan perbaikan (sja masak)	100	
6.	Hakhoet, gudang, pengukuran sab.	100	
<u>Pelaksanaan Bangunan.</u>			
7.	Pekerjaan tanah	100	
8.	Pekerjaan pondasi	100	
9.	Pekerjaan batu	100	
10.	Pekerjaan rangka (kuda2 tiang)	100	
11.	Pekerjaan rangka atap	100	
12.	Pekerjaan lantai	19,5	
13.	Pekerjaan djendela	50	
14.	Pekerjaan rangka atap	100	
15.	Plapon	50	
16.	Sinding	100	
17.	Hentjet	-	
18.	Dan lain - lain	-	

REVISI  
 Pimpin Proyek  
  
 (S. J. S. S.)

B. LAPORAN ADMINISTRASI :

Proyek di tetudui pada tanggal : 23-5-1971.-  
 Anggaran belanda meluruhanja : Rp. 2.315.670.-  
 Distorisear bujukan jang lalu : Rp. 2.315.670.-  
 sisa : " 1.157.835.-  
 Rp. 1.157.835.-

Otorisasi tahun 1971.

No.	Tanggal	Distorisear	Sisa	Tjatat
1.	-	Rp. -.-	-	Terang ke- I
2.	-	" -.-	-	Terang ke- II
3.	-	" -.-	-	Terang ke- III
4.	-	" -.-	-	Terang ke- IV

REVISI :  
 KEPALA DAERAH KAMPATAN ATJEH  
 T I N G G A N  
  
 HUSIN HUSIN

TANGGAL, 8 AGUSTUS 1971.-  
 Dipertuh untuk ke-I, II, III, IV, V, VI a/s  
 KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM KAMPATAN  
 ATJEH TINGG  
  
 HUSIN HUSIN

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
 2. Departemen Kesehatan  
 3. Departemen Pekerjaan Umum  
 4. Departemen Perhubungan  
 5. Departemen Pertambangan dan Energi  
 6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
 7. Departemen Perikanan dan Peternakan  
 8. Departemen Kehakiman  
 9. Departemen Sosial  
 10. Departemen Dalam Negeri  
 11. Departemen Luar Negeri  
 12. Departemen Keuangan  
 13. Departemen Riset dan Teknologi  
 14. Departemen Lingkungan Hidup  
 15. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
 16. Departemen Kebudayaan, Seni dan Kesenian  
 17. Departemen Pemuda dan Olahraga  
 18. Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional  
 19. Departemen Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
 20. Departemen Perumahan dan Kota Dinkes  
 21. Departemen Perhubungan Darat  
 22. Departemen Perhubungan Laut  
 23. Departemen Perhubungan Udara  
 24. Departemen Telekomunikasi  
 25. Departemen Meteorologi dan Geofisika  
 26. Departemen Hidrologi dan Meteorologi  
 27. Departemen Geologi dan Pertambangan  
 28. Departemen Pertambangan dan Energi  
 29. Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
 30. Departemen Perikanan dan Peternakan  
 31. Departemen Kehakiman  
 32. Departemen Sosial  
 33. Departemen Dalam Negeri  
 34. Departemen Luar Negeri  
 35. Departemen Keuangan  
 36. Departemen Riset dan Teknologi  
 37. Departemen Lingkungan Hidup  
 38. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
 39. Departemen Kebudayaan, Seni dan Kesenian  
 40. Departemen Pemuda dan Olahraga  
 41. Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional  
 42. Departemen Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
 43. Departemen Perumahan dan Kota Dinkes  
 44. Departemen Perhubungan Darat  
 45. Departemen Perhubungan Laut  
 46. Departemen Perhubungan Udara  
 47. Departemen Telekomunikasi  
 48. Departemen Meteorologi dan Geofisika  
 49. Departemen Hidrologi dan Meteorologi  
 50. Departemen Geologi dan Pertambangan

3. Departemen lain-lain

a. Proyek khusus : 25-2-1971  
 b. Uraian pelaksanaan : 1-4-1971  
 c. Anggaran : 25-5-1971

2. Departemen :
1. Departemen : Rp. 2.315.670,-
  2. Departemen : -,-
  3. Departemen : -,-

3. Departemen :
- a. Departemen : -,-
  - b. Departemen : -,-
  - c. Departemen : -,-
  - d. Departemen : -,-

1. Departemen : -,-  
 2. Departemen : -,-  
 3. Departemen : -,-  
 4. Departemen : -,-  
 5. Departemen : -,-  
 6. Departemen : -,-  
 7. Departemen : -,-  
 8. Departemen : -,-  
 9. Departemen : -,-  
 10. Departemen : -,-  
 11. Departemen : -,-  
 12. Departemen : -,-  
 13. Departemen : -,-  
 14. Departemen : -,-  
 15. Departemen : -,-  
 16. Departemen : -,-  
 17. Departemen : -,-  
 18. Departemen : -,-  
 19. Departemen : -,-  
 20. Departemen : -,-  
 21. Departemen : -,-  
 22. Departemen : -,-  
 23. Departemen : -,-  
 24. Departemen : -,-  
 25. Departemen : -,-  
 26. Departemen : -,-  
 27. Departemen : -,-  
 28. Departemen : -,-  
 29. Departemen : -,-  
 30. Departemen : -,-  
 31. Departemen : -,-  
 32. Departemen : -,-  
 33. Departemen : -,-  
 34. Departemen : -,-  
 35. Departemen : -,-  
 36. Departemen : -,-  
 37. Departemen : -,-  
 38. Departemen : -,-  
 39. Departemen : -,-  
 40. Departemen : -,-  
 41. Departemen : -,-  
 42. Departemen : -,-  
 43. Departemen : -,-  
 44. Departemen : -,-  
 45. Departemen : -,-  
 46. Departemen : -,-  
 47. Departemen : -,-  
 48. Departemen : -,-  
 49. Departemen : -,-  
 50. Departemen : -,-

4. Departemen : -,-

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Saldo	Statis
1.	Departemen	Rp. 2.315.670,-	-,-	-,-	-,-
2.	Departemen	-,-	-,-	-,-	-,-
3.	Departemen	-,-	-,-	-,-	-,-

5. Departemen : -,-



1. Departemen : -,-  
 2. Departemen : -,-  
 3. Departemen : -,-  
 4. Departemen : -,-  
 5. Departemen : -,-  
 6. Departemen : -,-  
 7. Departemen : -,-  
 8. Departemen : -,-  
 9. Departemen : -,-  
 10. Departemen : -,-  
 11. Departemen : -,-  
 12. Departemen : -,-  
 13. Departemen : -,-  
 14. Departemen : -,-  
 15. Departemen : -,-  
 16. Departemen : -,-  
 17. Departemen : -,-  
 18. Departemen : -,-  
 19. Departemen : -,-  
 20. Departemen : -,-  
 21. Departemen : -,-  
 22. Departemen : -,-  
 23. Departemen : -,-  
 24. Departemen : -,-  
 25. Departemen : -,-  
 26. Departemen : -,-  
 27. Departemen : -,-  
 28. Departemen : -,-  
 29. Departemen : -,-  
 30. Departemen : -,-  
 31. Departemen : -,-  
 32. Departemen : -,-  
 33. Departemen : -,-  
 34. Departemen : -,-  
 35. Departemen : -,-  
 36. Departemen : -,-  
 37. Departemen : -,-  
 38. Departemen : -,-  
 39. Departemen : -,-  
 40. Departemen : -,-  
 41. Departemen : -,-  
 42. Departemen : -,-  
 43. Departemen : -,-  
 44. Departemen : -,-  
 45. Departemen : -,-  
 46. Departemen : -,-  
 47. Departemen : -,-  
 48. Departemen : -,-  
 49. Departemen : -,-  
 50. Departemen : -,-

1. Departemen : -,-  
 2. Departemen : -,-  
 3. Departemen : -,-  
 4. Departemen : -,-  
 5. Departemen : -,-  
 6. Departemen : -,-  
 7. Departemen : -,-  
 8. Departemen : -,-  
 9. Departemen : -,-  
 10. Departemen : -,-  
 11. Departemen : -,-  
 12. Departemen : -,-  
 13. Departemen : -,-  
 14. Departemen : -,-  
 15. Departemen : -,-  
 16. Departemen : -,-  
 17. Departemen : -,-  
 18. Departemen : -,-  
 19. Departemen : -,-  
 20. Departemen : -,-  
 21. Departemen : -,-  
 22. Departemen : -,-  
 23. Departemen : -,-  
 24. Departemen : -,-  
 25. Departemen : -,-  
 26. Departemen : -,-  
 27. Departemen : -,-  
 28. Departemen : -,-  
 29. Departemen : -,-  
 30. Departemen : -,-  
 31. Departemen : -,-  
 32. Departemen : -,-  
 33. Departemen : -,-  
 34. Departemen : -,-  
 35. Departemen : -,-  
 36. Departemen : -,-  
 37. Departemen : -,-  
 38. Departemen : -,-  
 39. Departemen : -,-  
 40. Departemen : -,-  
 41. Departemen : -,-  
 42. Departemen : -,-  
 43. Departemen : -,-  
 44. Departemen : -,-  
 45. Departemen : -,-  
 46. Departemen : -,-  
 47. Departemen : -,-  
 48. Departemen : -,-  
 49. Departemen : -,-  
 50. Departemen : -,-



Lampiran Laporan berisikan : pembuangan/gelakannya rusak/robor  
 Tajant Kepala Pemerintahan Kabupaten  
 GILIN BARRA di Angkor.

No	Kategori	Jumlah	Unit	Nilai	Salinan	Tgl. Buat
----	----------	--------	------	-------	---------	-----------

1.	Indok beraja	1 buah	1 buah	-	1 buah	100
2.	Belian	150 m3	150 m3	-	150 m3	100
3.	Pasukan eliton/ Jantok	50 m3	50 m3	-	50 m3	100
4.	Pasukan Frontal	52 m3	52 m3	-	52 m3	100
5.	Pasukan baki baki	100 m2	100 m2	-	100 m2	100
6.	Pasukan Jantok	266 m2	50 m2	230 m2	100 m2	29,5
7.	Pasukan	490 m2	-	490 m2	-	-
8.	Koran platn ejaodola	10,56 m3	10,56 m3	4,8 m3	10,56 m3	100
9.	Bangka bodu-budu	3,7 m3	2,7 m3	1,0 m3	2,7 m3	75
10.	Platin/ajodola baki/jantok/ajantok	4,4 buah	22 buah	22 buah	22 buah	50
11.	lobong angin (gentilari)	21 buah	22 buah	10 buah	11 buah	50
12.	Pisipen	203 m2	105 m2	100 m2	103 m2	50
13.	Dinding pagar	326 m2	326 m2	-	326 m2	100
14.	tan plani	80 m	80 m	-	80 m	100
15.	Atap dari seng	338 m2	331 m2	-	331 m2	100
16.	Atap dari seng	700 m2	500 m2	200 m2	333 m2	100
17.	Atap dari seng	700 m2	500 m2	200 m2	333 m2	100
18.	K m p u r m	700 m2	500 m2	200 m2	333 m2	100
19.	M o n t a j a t	790 m2	-	790 m2	-	-



\* B A N D I T H A R T I \*



\* G I L I N B A R R A \*

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA AJAR/ PEMERIKSAAN

No. 398/PO/BAP/ IX - 71.-

Pada hari ini Sabtu, tanggal 4 September 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional.

Nama proyek : Perbaikan Prasarana Fisik Pamongreaja.-  
Nomor kode : 112.007.Gh2.06.-  
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri.-  
Lokasi : Kecamatan Silih Nara, Kab. Atjeh Tengah.-  
Pimpinan Proyek : Drs. Koswandi.-  
Bendaharawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh 1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPOP.-  
2. Ir. Iuran A. Rahman, Staf Teknis SPOP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan - Pemb. Kantor/Rumah Annex Tjamat Kepala Daerah Pemerintahan Silih Nara di Angkup Kabupaten Atjeh Tengah.-

yang diborongan kepada

PT ATJEH TENGAH

dengan Surat Perdjandjian No Borongan Dibawah Tangan No. 001/ V - 1971.

tanggal 22 Februari 1971 telah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report

No. tanggal 8 Agustus 1971 dan inspeksi yang

dilakukan pada tanggal, maka terdapat progress fisik sebesar

+ 70 % ( tujuh puluh perseratus ).-

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada pemborong Proyek ini telah dapat dilakukan pembayaran termijn ke III ( tiga ) sebesar Rp. 578.917,50

( lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh -  
belas 50/100 rupiah )

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipertanggungjawabkan.

PEMERIKSA :

*Mohd. Thahir*

2. *Said Abdullah*



Mengetahui :  
Wakil Kepala Daerah  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Wakil Kepala Daerah,

*Adi Wira Djaksa*

Wakil Kepala Daerah  
Adi Wira Djaksa Hrp. 66164.-



4 September 71.-

Wakil Kepala,

*Said Abdullah*

Wakil Kepala

Drs. SAID ABDULLAH

TEMBELUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di Banda Aceh.-
2. D.P.A.N. di Banda Aceh :
3. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.-
4. Bupati/Walikota Kab. Atjeh Tengah.-
5. Pimpinan Proyek jbs :
6. Peringgal.



PALEMBANG, 8 OKTOBER 1971.

Nomor : 5940/V-1971.

Lampiran : 7 x 3 lembar foto.  
1 berkas progress report.

Perihal : Progress report/visual foto  
atas pembangunan rumah annex/  
Kantor Tjamat Kepala Pemerintahan  
Kabupaten Ketjamatan Silih Nara.

K e p a d a  
BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ANGKUT TENGAH  
di  
P A L E M B A N G.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat ini, maka berlampiran dengan ini dikirimkan pada saudara progress - report visual foto dari pembangunan Kantor/Rumah annex Tjamat Kepala Pemerintahan Kabupaten Silih Nara di Angkup, dimana gedung tersebut telah selesai dikerjakan, dan dalam waktu singkat akan diserahkan terimakasih.

Dengan selesainya bangunan tersebut kepada Pembe-  
rang, telah dapat dilakukan pembajaranja untuk ter-  
minj ke IV (terakhir).

Demikian untuk saudara ketahui dan maklumi.-



BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ANGKUT TENGAH,  
S. HUBNIS SUPIS.



SURAT SERAH TERIMA  
ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR/RUMAH ANNEX  
TJAMAT KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN BILIH  
WARA DI ANGGUP - (AUSN PROJEK) 2.-

Pada hari ini SERAH tanggal 11 OKTUBER 1971, berdasarkan ke-  
pada surat Perdjandjian borongan tertanggal 22 FEBRUARI 1971 No:-  
041/V-1971 dan juga berdasarkan kepada Progress-report yang di-  
terbitkan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Umum Kabupaten Atjeh Te-  
ngah tertanggal 28 SEPTEMBER 1971, dimana pembangunannya jaitu:-  
Sebuah gedung Kantor/rumah annex Tjamat Kepala Pemerintahan Ketja-  
matan Bilih Wara di Angkup yang diikat dengan suatu surat Perjan-  
djian borongan tersebut diatas, antara kami BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN ATJEH TENGAH dengan Pendorong PT. ARJIE TENGAH, adalah se-  
bagai berikut:-

PERTAMA:

N a m a .....: TOK. ABDUL DJALIL.  
Pekerjaan/Jabatan .....: Presiden Direktur PT. Arjie Tengah.  
Tempat tinggal .....: Di Takengon.

(Yang disebut Pihak Kedua selaku Pendorong dalam Surat Perdjandji-  
an tersebut diatas).

KEDUA:

N a m a .....: MURDIN SUFIS.  
Pekerjaan/Jabatan .....: BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH.

(Yang disebut Pihak Pertama selaku Direksi dalam surat Perdjandji-  
an tersebut diatas).

1. Bahwasanya saja Pihak Kedua selaku Pendorong bangunan sebagai  
tersebut dalam surat Perdjandjian diatas, jaitu: Membangun sebua-  
h Gedung Kantor/Rumah Annex Tjamat Kepala Pemerintahan Ketja-  
matan Bilih Wara di Angkup, telah menyelesaikan tugas yang di-  
bebaskan Pihak Pertama dan dengan ini saja Pihak Kedua menje-  
rakan bangunan tersebut kepada Pihak Pertama selaku Direksi  
dalam keadaan baik dan sesuai menurut rentjana.
2. Saja Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah selaku Direksi  
di dengan ini telah menerima sebuah Bangunan Gedung Kantor/Ru-  
mah Annex. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamat Bilih Wara di  
Angkup dari Pihak Kedua selaku Pendorong dengan baik dan sesu-  
ai menurut rentjana.
3. Demikianlah Surat Serah - Terima Bangunan ini diperbuat dengan-  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya yang kemudian  
masing2 kami menanda-tangani dibawah ini:

TAKENGON, tanggal tersebut diatas.  
Diperbuat untuk ke: I, II, III, IV, --  
V dan VI.--

JANG MENYERIMA PENJERAIAN:

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

MURDIN SUFIS.-  
(selaku Direksi)

JANG MENYERAHKAN:

Presiden DIREKTUR PT. ARJIE  
TENGAH,

PT. PERS. DAERAH & PERUSAHAAN

ATJEH TENGAH.

TOK. ABDUL DJALIL.-  
(selaku Pendorong)



PROGRAM REPORT.

Tanggal :  
Kwartal :  
Nama Proyek : Pembangunan Kantor/Rumah Annex  
Tingkat Kepala Pemerintahan Ke-  
tjanaan Silih Para di Angkup.  
Propinsi : Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.  
Terletak : di - A n g k u p .

A. LAPORAN FISIK:

No.	Sahagian Pekerjaan	Progres	Tetapan
1.	Fenjelidikan portaka	100	
2.	Fenjelidikan langkap	100	
3.	Kontjona gob. (Denig) Anggaran belandja	100	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan pembuatan (djalan masuk)	100%	
6.	Heksheet, gudang, pengukuran dab.	100.	Berikat 7 x 3 lbr. foto.-
<u>Pelaksanaan Bangunan.</u>			
7.	Pekerjaan tanah	100	
8.	Pekerjaan pondamen	100	
9.	Pekerjaan batu	100	
10.	Pekerjaan rangka (kuda2 tiang)	100	
11.	Pekerjaan rangka atap	100	
12.	Pekerjaan lantai	100	
13.	Pekerjaan atap	100	
14.	Pekerjaan jendela	100	
15.	Plafon	100	
16.	Dinding	100	
17.	Kantjet	100	
18.	San lain-lain.	100	

B. LAPORAN ADMINISTRASI :

Projek disetujui pada tanggal : 25-3-1971.  
Anggaran belandja seluruhnja : Rp. 2.113.670.-  
Jumlah : Rp. 2.219.670.-  
Distorisasi bulan2 jang lalu : Rp. 1.157.633.-  
S i x a : Rp. 1.157.633.-

Otorisasi2 tahun 1971.

No.	Tanggal	Distorisasi :	Sisa	Tetapan.
1.	-	Rp. --	--	Terdaja ke-I
2.	-	Rp. --	--	Terdaja ke-II
3.	-	Rp. --	--	Terdaja ke-III
4.	-	Rp. --	--	Terdaja ke-IV

PONDON, 25 September 1971-

Diperbuat untuk nos. I, II, III, IV, V, VI a/d X  
KEPALA DINAS PERENCANAAN URBAN & TERBUKA  
DAERAH TERBUKA

HIMPUNAN:

Pimpinan Proyek Pembangunan Kantor Ketjanaan  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,

Drs. Komangti





DILIHAT DARI HADAPAN.



DILIHAT DARI SAMPING KIRI.



DILIHAT DARI BELAKANG.



Laporan Tahunan  
 Laporan Keuangan  
 Laporan Operasional  
 Laporan Laba Rugi  
 Laporan Arus Kas  
 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh auditor independen.

Laporan ini merupakan bagian integral dari laporan tahunan perusahaan.

Laporan ini menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh auditor independen.

Laporan ini merupakan bagian integral dari laporan tahunan perusahaan.



Direktur Utama  
 PT. BUNJANGA



Direktur Utama  
 PT. BUNJANGA



Departemen Pekerjaan Umum  
 Direktorat Jenderal Pengawasan Konstruksi  
 Gedung  
 Nomor: 111/1000/1997  
 Tanggal: 11 Agustus 1997

No. 111/1000/1997  
 Tanggal: 11 Agustus 1997  
 Kepada: ...  
 Dari: ...

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah
1	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
2	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
3	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
4	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
5	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
6	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
7	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
8	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
9	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100
10	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100	...	m <sup>2</sup>	100





SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 429/PO/DAI/ 1 - 71.-

Pada hari ini tanggal 25 Oktober 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional

Nama proyek : Pembangunan Prasarana Fisik Pemang Prodnj .-  
Nomor kode : 312000.042.05 .-  
Departemen/Lembaga : Dalam Negeri .- Tengah .-  
Lokasi : Kab. Silih Nara, Kab. Atjeh Tengah .-  
Pimpinan Proyek : Irs. Esmawati .-  
Bendaharawan Proyek : Said Abdullah .-

yang dilakukan oleh : 1. Ir. Mohd. Thahir, Staf Teknis SPDP.-  
2. Muchlis Jusua M, Staf Hukun SPDP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan - Pembangunan Kantor/ Rumah Tjandi Kepala Pemerintahan Silih Nara di Angkup Kabupaten Atjeh Tengah .-

yang diborongkan kepada :

PT ATJEH TENGAH

dengan Surat Perdjandjan Noj Pemborongan Diboroh Tengah No. 001/V - 1971 tanggal 22 Februari 1971 setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report No. tanggal 28 September 1971 dan inspekti yang dilakukan pada tanggal , maka terdapat progress fisik sebesar 100 % ( seratus perseratus ) dan telah melampai masa pemeliharaan .-

II. Mengingat Surat Perdjandjan tersebut maka kepada Pemborong Proyek ini telah dapat diberikan pembayaran termin ke IV ( empat ) terakhir sebesar Rp. 270.927,50

( dua lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima puluh )

x) Berita Atjara Sarah Terima tal. 21 Oktober 1971 yang diterima tgl. 23 Oktober 1971.-

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk seperi ini

PEMERIKSA :

1. *Mohd. Thahir*

2. *Muchlis Jusua M*

MENGETAHUI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*  
KORAN HARIAN - (2) =

25 Oktober 1971.-  
SEKRETARIS PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
DIREKTUR  
*[Signature]*  
Said Abdullah

- TEMBUSAN - dikirimkan kepada :
1. K.B.N./K.P.S.N. di Banda Atjeh .-
  2. D.P.A.M. di Banda Atjeh :
  3. Departemen Dalam Negeri di Djakarta .-
  4. Bupati/Walikota Kdn. Kab. Atjeh Tengah .-
  5. Pimpinan Proyek Jbs. :
  6. Peringgal.



Nomor : 6032/V-1971.

Lampiran: 1x4 lbr.

Perihal : Serah terima bangunan  
Gedung Kantor/Rumah su-  
mit Pjamat Kepala Peme-  
rintahan Ketjamatan Si-  
lih Nara. -----

K e p a d a

GUBERNUR KEPALA DAERAH PRO-  
VINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

di

BANDA ATJEH.

Assalamu'alaikum W.M.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat kami terdahulu  
tertanggal 6 Oktober 1971 No. 5948/V-1971, tentang Progress-  
report/Visuil foto atas bangunan tersebut pada pokok surat  
diatas, maka berlampiran dengan ini dikirimkan pada saudara  
Naskah serah terima fisik bangunan sesuai menurut surat per-  
djandjian antara kami dengan pihak Pemberong.

Demikian agar saudara maklum dan dapat dipergunakan  
seperlunya.-



BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

NERDIN SUPRI

TEMBUKAN:

Dengan hormat dikirimkan;

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Atjeh Tengah di Takengen.
2. Kepala Inspektorat Pengawasan Kabat. di Takengen.
3. Direktur PT. Atjeh Tengah di Takengen.
4. masing<sup>2</sup> untuk dimaklumi.
4. P e r t i n g g a l .-

TAKENGON, 23 FEBRUARI 1971.-

2574/9A  
07/3-71

No. 16570/V-1971.-

K e p a d a :

Lampiran : 1 (satu) berkas.-  
Perihal : Perdjandjian persetujuan  
berongan Pembangunan Rumah  
annex/Kantor Tjamat Kepala  
Pemerintahan Silih Nara.-

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH  
di  
B A N D A A T J E H.-

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Dengan segala hormat, untuk memenuhi kawat saudara No. 1044/a-A, tanggal 27 Djumari 1971, maka berlampiran dengan ini dikirimkan kepada saudara :

1. a. Berita atjarn penenderan yang telah dilakukan oleh Panitia Tender Kabupaten Atjeh Tengah, yang kami telah tundjuk dengan surat keputusan tanggal 1 Agustus 1970 (lihat lampiran 1 dan 2).
- b. Surat perdjandjian pemberongan atas pembangunan Rumah annex sebagai tersebut pada pokok surat ini, antara kami dengan pihak kedua P.T. Atjeh Tengah, yang ditutup dengan djumlah Rp. 2.315.670.-
2. Untuk terlaksananya dengan segera pembangunan ini, kami mohon persetujuan saudara, sembari mengirikkannya kebeli ke-kantor kami.
3. Perlu kami jelaskan bahwa tempat dimana Rumah annex tersebut didirikan, akibat tanah Pemerintah tidak ada tersedia yang berdekatan dengan Ibu kota Kecamatan Silih Nara, maka kami telah lakukan pembelian tanah sawah rakjat seluas 1(satu) Ha. dengan mengganti harga Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga sampai saat ini belum dilunasi dan dengan pengharapan untuk ini kami mohon dari biaya yang tersedia saudara drop lebih dahulu sebesar tersebut diatas.
4. Sebagai pertimbangan pihak saudara, dapat kami terakan disini, yaitu biaya bangunan yang di-ikat dengan surat perdjandjian diatas (pasal 1 sub b.) sedjumlah.....Rp. 2.315.670.-  
Ditambah harga 1 Ha. tanah .....Rp. 250.000.-  
**D j u m l a h.....Rp. 2.565.670.-**
5. Jika diperhitungkan dengan biaya yang tersedia sedjumlah Rp. 2.700.000.- - Rp. 2.565.670.- masih bersisa Rp. 134.330.- yang juga dari sisa ini dapat hendaknya saudara benarkan untuk pembelian alat2 perlengkapan dari Rumah annex/Kantor tersebut diatas selaku rumah Dinas.
3. Demikian agar saudara maklum selanjutnya mohon kabar.-

TAMBUSAN - tanpa lampiran dengan  
hormat dikirimkan kepada :

1. Pimpinan DITDA-GT, Kabupaten  
Atjeh Tengah di-Takengon.
2. Kepala Inspektorat Adm. dan  
Kabupaten A. Tengah di-Takengon,  
masing2 untuk dimaklumkan.
3. K e r t i n g g a l i.-



BUKALIA DAERAH  
ATJEH TENGAH,

( MURDIN SUFIE )

Handwritten initials or mark in the bottom left corner.



TAKENGON, 23 FEBRUARI 1971.-

25749A  
5/3-71

No. : 6570/N-1971.-

K e p a d a :

Lampiran : 1 (satu) berkas.-  
Perihal : Perdjandjian persetujuan  
borongan Pembangunan Rumah  
annex/Kantor Tjamat Kepala  
Pemerintahan Silih Nara.-

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH  
di  
B A N D A A T J E H.-

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Dengan segala hormat, untuk memenuhi kawat saudara No. 1044/2-A, tanggal 27 Djumari 1971, maka berlampiran dengan ini dikirimkan kepada saudara :

1. a. Berita atjara penenderan yang telah dilakukan oleh Panitia Tender Kabupaten Atjeh Tengah, yang kami telah tundjuk dengan surat keputusan tanggal 1 Agustus 1970 (lihat lampiran 1 dan 2).  
b. Surat perdjandjian pemberongan atas pembangunan Rumah annex sebagai tersebut pada pokok surat ini, antara kami dengan pihak kedua P.T. Atjeh Tengah, yang ditutup dengan djumlah Rp. 2.315.670.-
2. Untuk terlaksananya dengan segera pembangunan ini, kami mohon persetujuan saudara, sendari mengirikkannya kembali ke-kantor kami.
3. Perlu kami jelaskan bahwa tempat dimana Rumah annex tersebut didirikan, akibat tanah Pemerintah tidak ada tersedia yang berdekatan dengan Ibu Kota Kecamatan Silih Nara, maka kami telah lakukan pembelian tanah sawah rakjat seluas 1 (satu) Ha. dengan mengganti bargaannya sedjumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana bargaannya sampai saat ini belum dilunasi dan dengan pengharapan untuk ini kami mohon dari biaya yang tersedia saudara drop lebih dahulu sebesar tersebut diatas.
4. Sebagai pertimbangan pihak saudara, dapat kami terangkan disini, yaitu biaya bangunan yang di-ikat dengan surat perdjandjian diatas (pasal 1 sub b.) sedjumlah.....Rp. 2.315.670.-  
Ditambah harga 1 Ha. tanah .....Rp. 250.000.-  
D j u m l a h.....Rp. 2.565.670.-

5. Jika diperhitungkan dengan biaya yang tersedia sedjumlah Rp. 2.700.000.- -- Rp. 2.565.670.- masih bersisa Rp. 134.330.- yang djuga dari sisa ini dapat hendaknya saudara benarkan untuk pembelian alat2 perlengkapan dari Rumah annex/Kantor tersebut diatas selaku rumah Dinas.

6. Demikian agar saudara maklum selanjutnya mohon kabar.-

TERKURAN - tanpa lampiran dengan  
hormat dikirimkan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten  
Atjeh Tengah di-Takengon.
2. Kepala Inspektorat Adm. dan  
Kabupaten A. Tengah di  
ngon, masing2 untuk dimak.
3. P e r t i n g g a l.-



BERATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

( NURDIN SIFIE )

Handwritten initials or mark in the bottom left corner.



**MUSYAWARAH : Rapat Panitia Yand-er Kabupaten  
Atjeh Tanggal tanggal 10-3-1971.-**

**Pertemuan :**  
**Tanggal :**  
**Waktu :**  
**Jang hadir :**  
**Atjara :**  
**Pimpinan :**  
**Penulis :**  
**Djam :**

**di Ruang Kantor Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Tengah .**  
**10 Februari 1971.**  
**10.00.**  
**18 orang undangan terdiri dari anggota dan pembarung.**  
**Membicarakan masalah Pelaksanaan Pembangunan Kantor Tjunt Kepala**  
**Pemerintahan Kotjantung Hilir Nara di Angja-b.**  
**Salinan Study (anggota Panitia).**  
**Secretaris Panitia.**  
**9.15 s/d. 12.00 Wib.**

**Bilasan Ruang :**

**Pembahasan :**

**1. Salinan Salinan Study**

Utjapan terima kasih atas kehadiran undangan salinan do-  
 ngan keast Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa  
 Atjeh untuk bangunan Ruang Kantor Kotjantung Hilir Nara  
 djotra itu hadi undang untuk melihat gambar + bestek.  
 Rapat jang baru kali ini hadir perni djaga hadi hitjangan  
 ajran ~~salinan pembangunan~~ sebagai pembarung hitjangan

Siaran terasat ialah :

- 1. Atas Notaris ( Nara Nara ).
- 2. Panitia Yand-er.
- 3. Tidak terasat dalam 0,25 s.
- 4. Surat rekomendasi dari Dinas P.U.
- 5. Pura tanah sili jang dibuktikan dengan suratjara dari  
 jang berangkutan.
- 6. Lembaran dalam model dilampirkan
- 7. a. Daftar inventaris jang dimiliki.  
 b. Perijinan keangjapan dengan besja 25% dari harga  
 berangan, tidak hadi hari varedat dalam berangan.  
 Demikian ajran untuk Nara salinan.

Selain Nara salinan gambar, tuch terasat dengan  
 sementara belum dapat ditandjeh, karena belum clear, terasat  
 terasat tidak didalam rana.

Spesifikasikan pedoman dan dilampirkan dengan perijinan  
 dari undangan

**Pertemuan :** P.U. Atjeh Tengah Untuk menentukan terasat sili-  
 pa berangan itu djatah, bagaimana ajran hitjara.

**Siaran :** Pan. anggota (Atjeh Hilir P.U.) mendjelaskan aj-  
 ran terasat terasat prosedur lalaj.

**Pembahasan :** Nara Nara mengenai uang djawa diperoleh ?

**Siaran :**

1. Pimpinan : Mendjelaskan dari uang ini berada di Nara Atjeh.
2. Atjeh : Mengenai uang ini sudah terasat di Kantor Guber-  
 nar Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Spesifikasikan pedoman mengenai gambar dan bestek pada tj-  
 lan pembarung dibawah ini :

1. P.U. Atjeh Tengah.
2. Nara.
3. Pa. N. Nara Nara.
4. P.U. Garuda Contractor.
5. C.V. Hitjangan.
6. Nara Nara.
7. Nara Nara.
8. N. N. Nara.

Selanjut pedoman gambar dan bestek, pimpinan mendjelaskan  
 waktu penenturan penenturan sili tanggal 11-3-1971 ditandjeh tanggal  
 17-3-1971 djur 12.00 s/d dan tanggal 18-3-1971 dilampirkan pedoman  
 penenturan di Kantor Dinas P.U. Kabupaten Atjeh Tengah.

Bestek yang tidak ada lagi hadi jang atas hitjangan, maka  
 rapat diakhiri djur 12.00 Wib

Demikian salinan ini diperasat dengan ajran.

Atjeh,

Tanggal 10 Februari 1971.-

Atjeh,

Atjeh,



PAKITA LELANG BONGSIAN PEKERJAAN/PROJEK PEMBANGUNAN  
KAMPATIN ATJEH TENGAH.

KEPUTUSAN ATJAH KIBALAH LELANG  
KEBUNCIAN.

No. : 4/PLM/3/1971.

PEKERJAAN : Pembangunan Kantor Tjamat Kepala Pemerintahan Kotjamatan  
Silih Nara di-Ingkoh.

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Februari tahun  
1971 tujuh puluh satu djam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan  
bertempat diruangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Tengah  
kami masing-masing sebagai Ketua merangkap anggota serta Sekretaris Pa-  
nitia tersebut diatas jang diangkat dengan surat keputusan Bupati/Kepala  
Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 1 Agustus 1970 No.26/VIII/1970,  
menarangkan sebagai berikut :

1. Waktu penutupan penawaran pemborong untuk pekerjaan tersebut diatas  
ditutup tanggal 17 Februari 1971 djam 12.00 Wib.
2. Membuka tang dalam mana beriad daftar/surat2 penawaran dan menjatakan  
terdapatnya sampul.
3. Memeriksa dan menjatakan sampul2 terutup dan menemki ajarat2 jang  
ditentukan.
4. Membuka sampul2 dan menjatakan penawaran2 sebagai berikut :

<u>P e m b o r o n g :</u>	<u>Nama Penawaran</u>
I. <u>C.V. Siatokan.</u>	Rp. 2.540.352.-
II. <u>Mong A Han.</u>	Rp. 2.837.090.-
III. <u>Fa. H. Anas Kaba.</u>	Rp. 2.728.600.-
IV. <u>Garuda Contractor.</u>	Rp. 2.700.000.-
V. <u>S a r o h a.</u>	Rp. 2.673.052,80
VI. <u>P.T. Atjeh Tengah.</u>	Rp. 2.315.670.-
VII. <u>Abd. Rachman.</u>	Rp. 2.336.150.-
VIII. <u>H. Jusuf.</u>	Rp. 2.498.492,05

5. Pada tiap2 daftar/surat penawaran dilampirkan ajarat2 jang diminta.

6. Penawaran jang diterima adalah : P.T. A T J E H T E N G A H .

berumah tinggal di T A K E N G O N .

Djumlah Rp. 2.315.670.- (Dua djuta tiga ratus lima belas ribu enam  
ratus tujuh puluh rupiah).

PAKITA LELANG BONGSIAN PEKERJAAN/PROJEK  
PEMBANGUNAN KAMPATIN ATJEH TENGAH;

Ketua

( SAHIB )..

Sekretaris

( SAHIB AL RASJID SA. )..



Nomor 001/V-1971.-

--- Pada ini hari tanggal dua puluh dua Februari 1971 tujuh puluh satu, jang bertanda tangan dibawah ini:

1. -----MURDIN SUPLIS-----  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, bertindak atas nama--  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, selanjut--  
nja disebut Pihak Pertama.

2. -----TKK. ABDUL DJALIL-----  
Direktur Pt. Atjeh Tengah dengan akte Notaris Mangaradja Parliindu--  
ngan tanggal 28 Nopember 1949 sebagai penjelenggara pekerdjaan No--  
taris buat Daerah jang melingkupi Keresidenan Atjeh dahulu di Ku--  
taradja menurut ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Sep--  
tember 1948 no. 47/7/G.S.O./48 dan ketetapan Menteri Kehakiman R.I.  
tanggal 10 Djanuari 1950 No. 1.; tempat tinggal di Takongen, selan--  
djutnja dalam perdjandjian ini selaku Pemborong disebut Pihak Ke--  
dua.

----- Bahwasanja antara pihak I dan pihak II, telah mengadakan--  
suatu perdjandjian sebagai berikut: -----

Pasal 1.

Pihak Pertama dalam djabatannya tersebut diatas telah memberi tu--  
gas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu se--  
kehendak Pihak Pertama untuk menjelenggarakan pekerdjaan:-----

----- "Mendirikan Rumah AnheK/gedung Kantor Tjamat-----  
----- Kepala Pemerintahan Ketjamatan Silih Nara-----  
----- terletak di A n g k u p".-----

Pasal 2.

Pekerdjaan tersebut harus sekehendak Direksi dan diselesaikan se--  
lambat-lambatnja tanggal 22 Djuli 1971. Didalam kedjadian sebagai--  
mana dimaksud dalam pasal 48 S.U., oleh Direksi tempo penjerahannja  
dapat diperpanjang setelah mana memperoleh kekuasaan dari Guber--  
nur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh eq. Bupati Kepala  
Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.-----

Pasal 3.

Pekerdjaan tersebut harus diselenggarakan menurut gambar dan bentuk  
terlampir dan selanjutnja menurut sjarat-sjarat perstudjium dan--  
petunjuk-petunjuk Direksi.-----

Pasal 4.

Bilamana penjerahan tidak dapat dilangsungkan pada waktu jang telah  
ditetapkan pada pasal 2 diatas, maka pihak Kedua diwadjibkan menbu--  
jar denda se-rendahnja 1% dari harga borongan atau sebesar Rp.----  
2.315,67 ( dua ribu tiga ratus lima belas 67/100 rupiah ) setiap ha--  
ri kelambatan, se-tinggi2nja 10% dari harga borongan atau sebesar--  
Rp.231.567,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh--  
tujuh rupiah ), denda mana diharuskan dibayar se-mata-mata setelah--  
habis tempo jang telah ditentukan, diketjualikan ketentuan-ketog--  
tuan lebih dahulu dari kelalaian pemborong atas menepati kewadajiban  
nja.-----

Pasal 5.

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjelenggaraan bordjalan tidak--  
lantjar atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak menjabut kembali  
pekerdjaan itu dari pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau men--  
berikan pekerdjaannya untuk diselesaikan kepada pemborong lain atas  
biaya pihak Kedua.-----

Pasal 6.....



Fasal 6.

Waktu (tempo pembetulan dalam pasal 55 S.U adalah 40 (empat puluh) hari kalender).

Fasal 7.

Harga borongan sedjumlah Rp.2.315.670,- (dua djuta tigaratus limabelas ribu enam ratus tadjuhuluh rupiah), jang akan dibayar dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan perintjian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,- = Rp.578.917,50 ( limaratus tadjuhuluhdelapan ribu sembilanatus tadjuhbelas 50/100 rupiah ), dibayar setelah pelaksanaan tersebut pada pasal 1 diatas sudah disiapkan oleh pihak Kedua kira-kira 35%.
2. Pembayaran kedua sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,- = Rp.578.917,50 ( limaratus tadjuhuluhdelapan ribu sembilanatus tadjuhbelas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak Kedua kira-kira 30%.
3. Pembayaran ketiga sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,- = Rp.578.917,50 ( limaratus tadjuhuluhdelapan ribu sembilanatus tadjuhbelas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut sudah siap dilaksanakan oleh pihak Kedua kira-kira 75%.
4. Pembayaran keempat sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,- = Rp.578.917,50 ( limaratus tadjuhuluhdelapan ribu sembilanatus tadjuhbelas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut disiapkan keseluruhanja oleh pihak Kedua dan diterima baik oleh pihak Pertama.

Fasal 8.

Perhitungan pekerdjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerdjaan terjdijat atas dasar dari harga kesetuan jang terlampir.

Fasal 9.

Direksi dari pekerdjaan akan dilaksana oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.

Fasal 10.

Padjak djasa sebesar 4% x Rp.2.315.670,- = Rp.92.628,80 ( sembilanuluhdua ribu enamatusduapuluhenam 80/100 rupiah ) dan padjak pembangunan Daerah sebesar 1% x Rp.2.315.670,- = Rp.23.156,70 ( duapuluhtiga ribu seratus limapuluhenam 70/100 rupiah ), menjadi tanggungan pihak Kedua.

Fasal 11.

Angkos bea meterai dari persetujuan ini sebesar 1 2/100 dari harga borongan atau 1 2/100 x Rp.2.315.670,- = Rp.3.315,67 ( duaribu tigaratuslimabelas 67/100 rupiah ) dibebankan kepada pihak Kedua.

Fasal 12.

Pada penjelenggaraan pekerdjaan ini berlaku jang abejah dan mengikat Algemeen en voorwarden v/d uitvoering bij aanwending v/d openbarewerken jang disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lembaran Negara No,14871), jang selanjutja disebut A.V atau (S.U) selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal surat perdjandjian ini.

Fasal 13.

Sema perselisihan akan diselesaikan dengan musjawarah dan djika tidak diperoleh penyelesaian jang diharapkan melalui musjawarah ini dalam pandangan jang pantas dan adil, maka pihak Pertama berhak mengadjakkan perselannya ke Pengadilan Negeri sebagai perkara Perdata, sedangkan untuk tidak terjadinya kematjatan pekerdjaan selama perkara belum diputuskan, pihak Pertama berhak mentjebak pekerdjaan dari pihak Kedua untuk diteruskan pada peborong lain.

Fasal 14. ....

Demikianlah surat persetujuan Perjanjian pemborongan ini dibuat di Takengon pada hari, bulan dan Tahun tersebut diatas rangkap 13 (tiga belas).

Pihak kedua  
Pemborong,

P.T. Perusa. Dagang & Pengangkutan

"ATJEH TENGAH"

TAKENGON

•• PK. ABDUL DJALIL ••

Pihak pertama;

SUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

•• MURDIN SUPIN ••



Pd. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN ATJEH TENGAH,

*[Handwritten signature]*

•• BAZJAH ••

Mengetahui/mengetujui :

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

*[Handwritten signature]*  
( Dr. P. R. ... )







DAFTAR: Upah/Bahan bangunan/Bahan makanan  
bulan Februari 1971 dalam daerah  
Kabupaten Atjeh Tengah.-

No.	Uraian	Takengen.	Silih Hara
<b>I. UPAH PEKERDJA SIHARI</b>			
1	orang pekerdja biasa.....	225,--	250,--
1	orang mandor.....	300,--	350,--
1	orang Tk.kaju/tjet/batu.....	400,--	450,--
1	orang kepala tukang.....	500,--	500,--
1	orang djaga malam.....	200,--	250,--
<b>II. HARGA BAHAN2 BANGUNAN.</b>			
1	M3 kaju sedang djempa/kali.....	13.000,--	13.000,--
1	M3 kaju meranti.....	20.000,--	21.000,--
1	M3 kaju merbo.....	40.000,--	41.000,--
1	M3 kaju sementuk.....	30.000,--	31.000,--
1	M3 kaju demar laut.....	30.000,--	31.000,--
1	M3 kaju tjetakan.....	10.000,--	10.000,--
1	M3 kaju bulat.....	5.000,--	5.000,--
1	M3 batu gunung/kali.....	1.750,--	1.500,--
1	M3 krikil(koral).....	1.750,--	1.500,--
1	M3 pasir pasang.....	1.750,--	2.500,--
1	M3 pasir urug(timbangan).....	1.250,--	1.200,--
1	bh batu bata.....	13,50	15,--
1	sak P.cement 50 Kg.....	1.000,--	1.100,--
1	kg paku.....	150,--	175,--
1	kg paku seng.....	300,--	325,--
1	gros sekrup kaju.....	750,--	750,--
1	kg baut2 bengel2.....	400,--	400,--
1	kaki stap seng No.51.....	90,--	92,50
1	kaki stap seng No.36.....	55,--	57,50
1	ke-ki seng rata(plast) No.32.....	90,--	92,50
1	kg kawat putih.....	170,--	175,--
1	kg kawat duri.....	150,--	150,--
1	M2 kawat njaruk.....	200,--	200,--
1	M2 kawat harmonica.....	300,--	300,--
1	stel kuntji unia.....	1.750,--	1.750,--
1	stel kuntji tanam tjap kuda.....	1.500,--	1.500,--
1	pasang engsel tjabut(Pensels).....	170,--	170,--
1	pasang engsel kupu2.....	75,--	75,--
1	pasang kait angin.....	75,--	75,--
1	stel grendel putar.....	1.200,--	1.200,--
1	buah rabupijee.....	150,--	150,--
1	kg tjet dasar.....	300,--	300,--
1	kg tjet kilat sico.....	350,--	350,--
1	kg tjet silat luar negeri.....	550,--	550,--
1	kg tjet tembok(emulsion point).....	500,--	500,--
1	kg dampul.....	250,--	250,--
1	liter minjak tjet a.....	300,--	300,--
1	kg tepung tjet.....	125,--	125,--
1	kg menie kaju(loosmenie).....	300,--	300,--
1	liter minjak dampul.....	350,--	350,--
1	liter peletur.....	200,--	200,--
1	kg tepung warna.....	150,--	150,--
1	kg kapur batu.....	35,--	35,--

Bahan2 makanan.....



BAHAN2 MAKANAN.

III. 1.kg beras.....	kg	50,--	kg.	50,--
1 kg djagung.....	"	70,--	"	70,--
1 kg daging.....	"	350,--	"	350,--
1 kg ikan asin.....	"	150,--	"	150,--
1 kg ikan asin busah.....	"	200,--	"	200,--
1 liter garam.....	"	25,--	"	25,--
1 kg gula pasir.....	"	120,--	"	120,--
1 butir telur ayam/itik.....	"	20,--	"	20,--
1 kg gula tebu.....	"	80,--	"	80,--
1 kaleng susu manis.....	"	120,--	"	120,--
1 liter minyak lampu.....	"	20,--	"	20,--
1 liter minyak bensin.....	"	25,--	"	25,--

-----000000-----

Takengon, 16 Februari 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Atjeh Tengah,

*[Handwritten Signature]*  
 (B A S J R A H).-

**PERDAJELASAN DAN SJARAT-SJARAT**  
**(BESTEK IN VOORWAARDEN)**

Pekerjaan membangun sebuah rumah annex/Kantor Pjnsat Kepala Pemerintah  
Kotjaantun Bilah Nara Angkup Kabupaten Atjeh Tengah.

B a b - I.

Pendjelasan Umum.

Pasal 1. Peraturan Umum.

- a. Untuk pekerjaan ini sebagai peraturan yang bersifat umum berlaku "De Algemene Voorwaarden voor de mit voering in aarising van openbare werken" yang disingkat A.V (Sjarat2 Umum yang disingkat S.U) yang disaldkan dengan surat Keputusan Pemerintah tgl. .... No. .... ( L.N. thn. .... No. .... ).
- b. Peraturan setempat serta segala Peraturan dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan pekerjaan ini harus dipemhi.

Pasal 2. Pendjelasan dan sjarat2 serta gambar2.

Untuk melengkapi pasal 30 A.V diadakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada pendjelasan dan sjarat (Bestek) ini terlampir satu helai gambar.
- b. Apabila terdapat perselisihan antara bestek dan gambar maka bestek inilah yang mengikat.

Pasal 3. Bonheer dan Direksi.

- a. Yang bertindak sebagai Bonheer dan Direksi untuk pekerjaan ini, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah atau wakilnya yang ditundjuk untuk itu.
- b. Dalam bestek ini selanjutnya disebut Direksi.

Pasal 4. Pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh Direksi atau wakilnya dan ditempat pekerjaan ditempatkan pegawai harian yang akan

- a. Mengawasi pekerjaan pemborong.
- b. Membuat tjtatan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Dengan siapa pemborong dapat merundingkan bagaimana pada umumnya tjara mengatur dan melaksanakan pekerjaan.
- d. Menjaga agar bestek dan gambar dipemhi oleh pemborong.

Pasal 5. Pe-muai dan Pemborong yang melaksanakan pekerjaan.

- a. Pemborong harus menunjuk seorang pegawai yang ahli dalam pekerjaan setiap hari.
- b. Pegawai tersebut diberi kuasa penuh untuk bertindak atas nama pemborong.
- c. Pegawai tersebut harus ada ditempat setiap hari kerja.

Pasal 6. Pemborong kawahan.

Untuk pekerjaan ini pemborong tidak dibenarkan memakai "Pemborong kawahan" dan bila hal ini terjadi, maka Direksi berhak mentjabut kembali pekerjaan dari pemborong dan melandjutkannya sendiri atau menjerahkannya kepada pihak lain dengan biaya pemborong.

Pasal 7. Pe-netapan ukuran.

Pemborong bertanggung djawab atas tepatnja ukuran pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran2 yang ditentukan pada bestek ini dan gambar.

Pasal 8. Pendjagaan.

- a. Pemborong harus mengadakan pendjagaan atas pekerjaan yang dilaksanakannya.
- b. Semua alat2 perlengkapan kerja dan bahan2 harus disimpan dalam gudang, sehingga terhindar dari segala matjan korusakan dan ketjirian.
- c. Semua perkakas dan alat pembantu untuk pekerjaan ini yang diperikannya harus baik dan kuat sehingga tidak menidulikan ketjelaannya.



Fasal 9. Keselamatan dan keselamatan kerja.

- a. Pemborong bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya pada umumnya.
- b. Pada tempat bangunan harus disediakan obat-obatan.
- c. Pada tempat bangunan harus disediakan minuman yang dimasak.
- d. Pada tempat bangunan harus disediakan W.C yang bersih.
- e. Apabila terjadi kecelakaan pada pekerjaan, pemborong harus segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan tersebut dan segera memberi pertolongan kepada Dirakai.

Fasal 10. Pekerjaan tambahan dan pengurangan.

Perhitungan tambahan pekerjaan dan pengurangan akan dilakukan menurut A.V pada anggaran yang mendahului pekerjaan terakhir.

Fasal 11. Biaya bahan dan harga bahan.

Harga bahan dan upah ditentukan berdasarkan atas apa yang berlaku pada waktu ini, mengenai upah, jaminan sosial, perbandingan mata uang, angka pengangkutan bahan, Peraturan, syarat asuransi dan sebagainya dan Peraturan Pemerintah yang diketahui berlaku hingga waktu ini. Jika dalam hal tersebut terjadi perubahan sebagai akibat keadaan nyata apapun juga termasuk akibat dari Pemerintah, moneter atau lainnya, maka akibat dari perubahan itu akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambahan atau pengurangan.

Fasal 12. Perselisihan.

Ajat 1 dan 2 dari pasal 80 A.V tidak berlaku, perselisihan yang hanya mengenai hal-hal yang bersifat teknik akan diselesaikan oleh suatu Panitia Arbitrase, yang dimaksudkan dalam ayat 3 dari pasal tersebut, sedangkan perselisihan mengenai hal-hal lain diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Fasal 13. Syarat-syarat tambahan.

- a. Apabila dalam bentuk ini dalam hal pembelian bahan pekerjaan tidak disebut dengan perkataan harus dimasukkan pemborong atau harus dipasang oleh pemborong, perkataan tersebut betul dimasukkan dalam pertanda yang bersangkutan jika hal tersebut terang termasuk dalam pekerjaan yang diborongkan dan memang tidak tegas disebutkan sebaliknya.
- b. Pekerjaan yang terang termasuk dalam pekerjaan yang diborongkan dan tidak ditelakan dalam bentuk ini harus diselenggarakan oleh pemborong seperti pekerjaan tersebut ditelakan dalam bentuk ini agar supaya penjelenggaraan pekerjaan ini menurut pertimbangan Dirakai dapat mentjapai penyelesaian yang sungguh baik.

B a b - II.

Penjelasan Pe-kerjaan.

Fasal 14. Pekerjaan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. 4 (empat) buah kamar.
- b. 2 (dua) buah gudang.
- c. 1 (satu) buah dapur.
- d. 2 (dua) buah kamar mandi dan W.C.
- e. 1 (satu) buah bak esur.
- f. Tinggi bangunan dihitung dari lantai.
- g. Atap seng No. 34.
- h. Dinding dikotakan litjin luar dalam dan berlidab.
- i. Tiang terdiri dari beroti kayu sedang tjempu, dikotakan litjin, berukuran 10 x 10 cm.
- j. Lantai dibuat dari pada beton dipelister litjin.
- k. Pintu kamar dan pintu depan jelusasi.
- l. Djendela kamar sisir dan ditjet dari katja.
- m. Djendela depan pakai katja.
- n. Tiap-tiap loteng memakai pijan dan terdiri dari eternit (asbes).



- o. Dinding dibuat setengah beton, bagian sebelah luar ditjet siran pasir dan dikapur dua kali, bagian dalam tjet warna.
- p. Tjutjuran air dari atap dibuat talang patahan dari seng dan seluruh bulat ketanah.
- q. Hal-hal yang tidak disebut dalam berteck tanjakan langsung pada Diraksi.

B a b - I I I .

P e n u t u p .

Pasal 15. Bahan-bahan bangunan semua harus disediakan oleh pesborong dan ditempatkan pada tempat dimana bangunan tersebut didirikan. Diaja pembuatan surat-surat djaga mandjadi tanggungan pesborong.

— — — — —

PESBORONG :

P.T. " ATJEH TENGAH " KAWANAN

Diraktor,

" ATJEH TENGAH "

TAKEN

( Tak. ABUL DJALIL ) .-



KEPALA DAERAH KABUPATEN

ATJEH TENGAH,

( MURDI SIFIL ) .-

Diketahmi oleh :

Pd. Kepala Dinas P.U. Kabupaten  
Atjeh Tengah,

( SASJEAN ) .-

Disetujui oleh :

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH

( \_\_\_\_\_ ) .-






RENTJANA


MENDIRIKAN KANTOR ANNEX / RUMAH ASISTEN WEDANA

SILIH - NATAK

SEMI PERMANEN DI KABAT

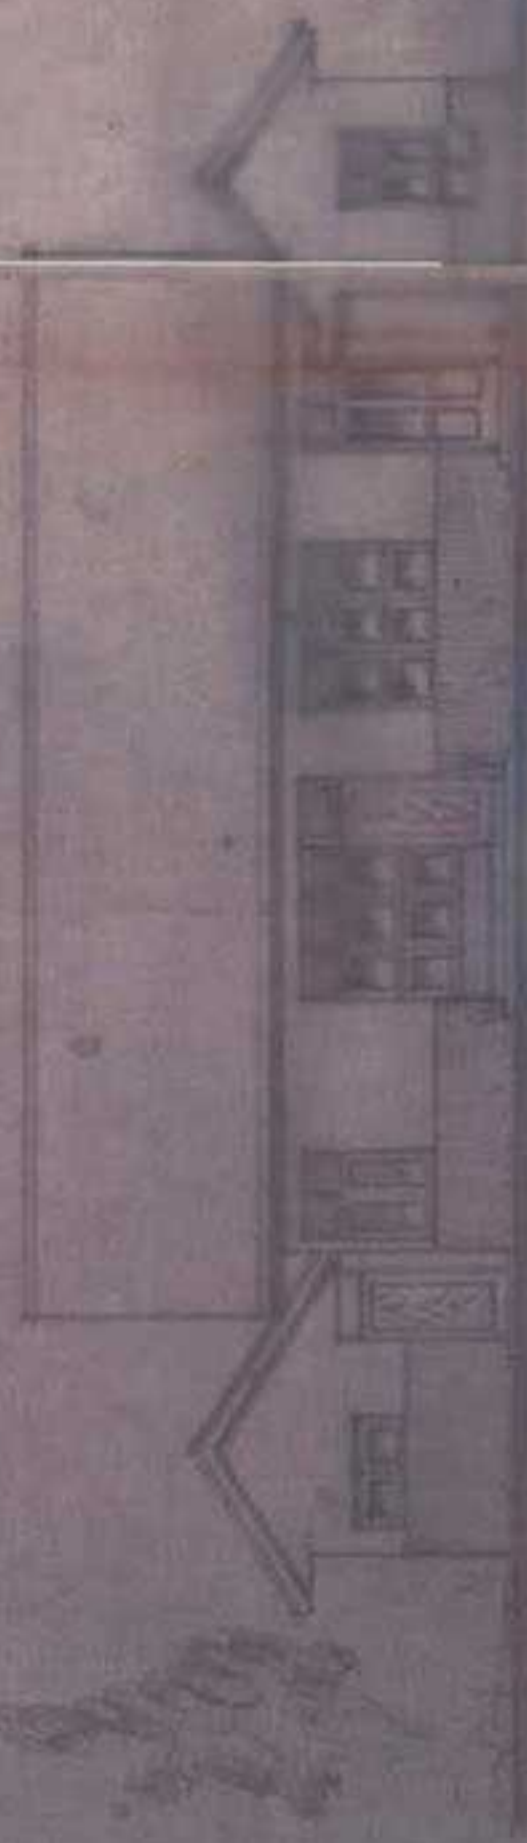


TAMPAK DEPAN

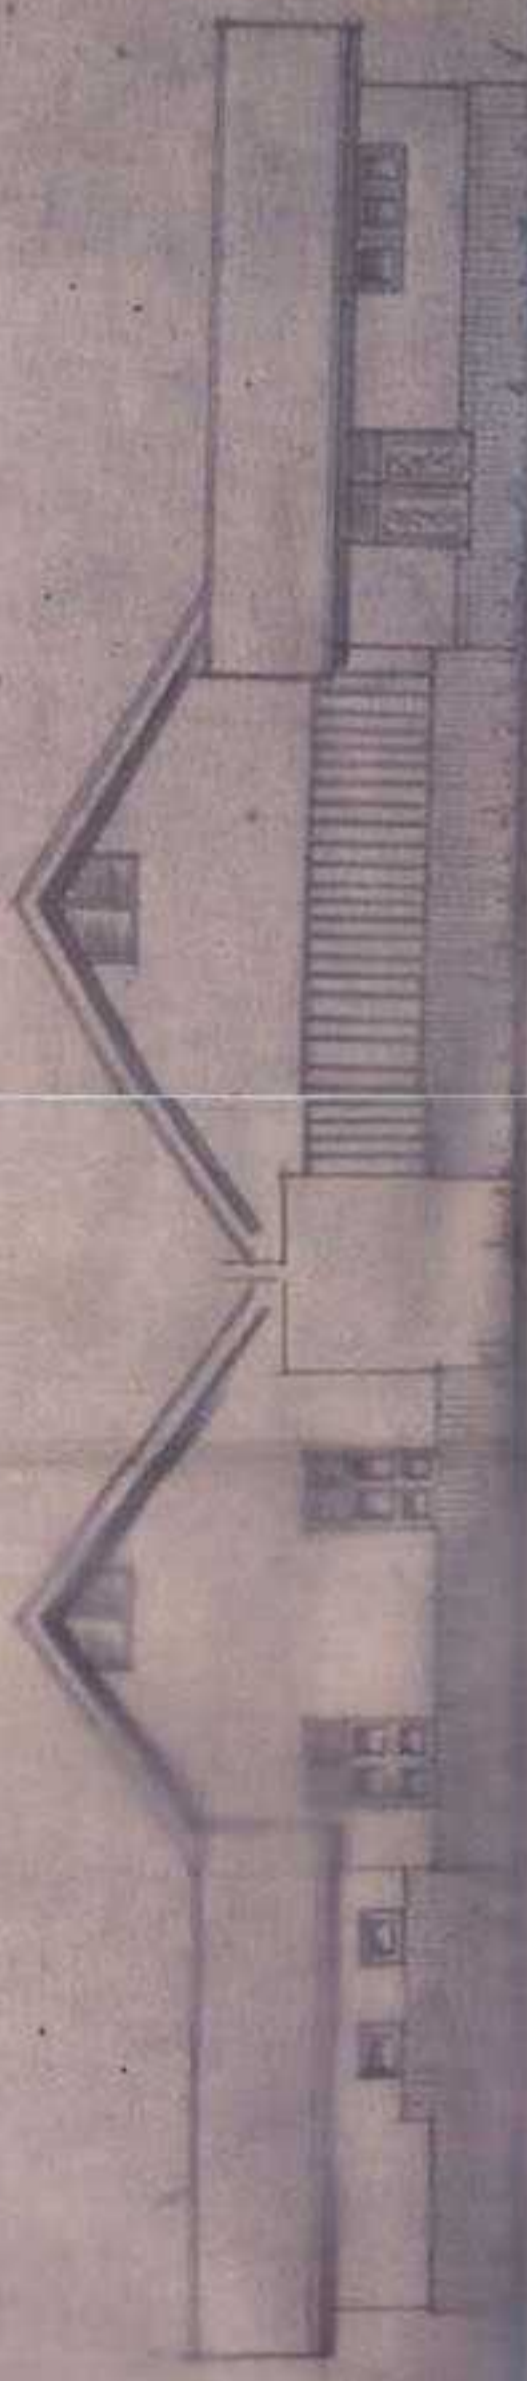


TAMPAK KIRI

TAMPAK KANAN


1:100

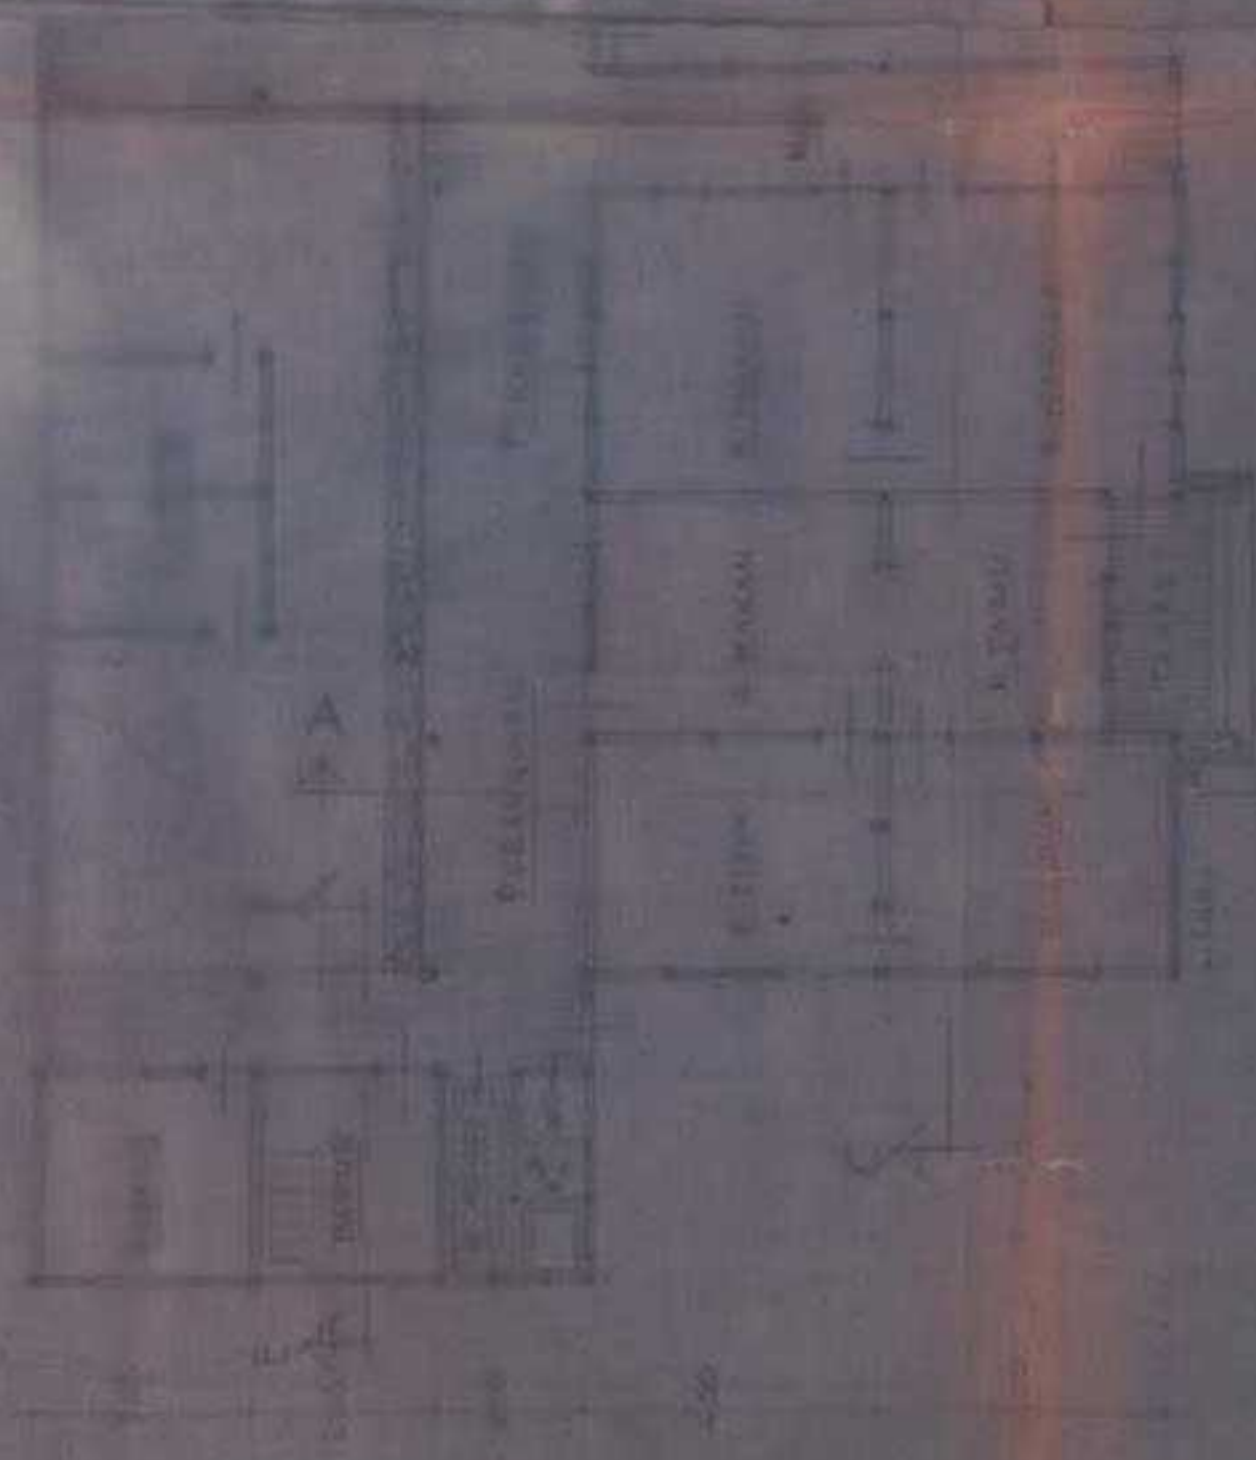

PEMBAH

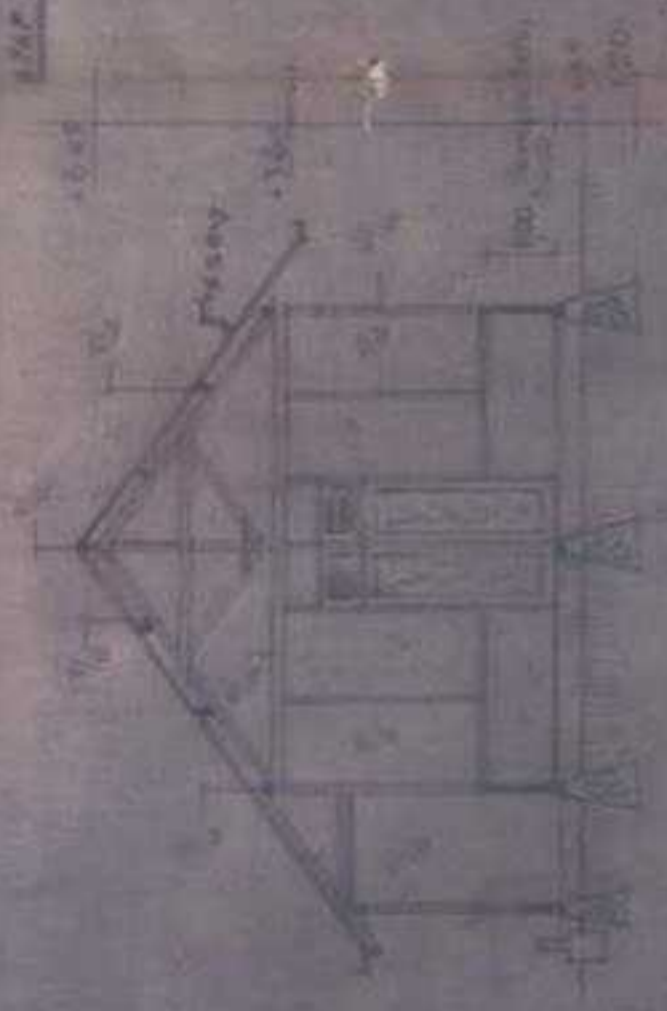

POTONGAN AB

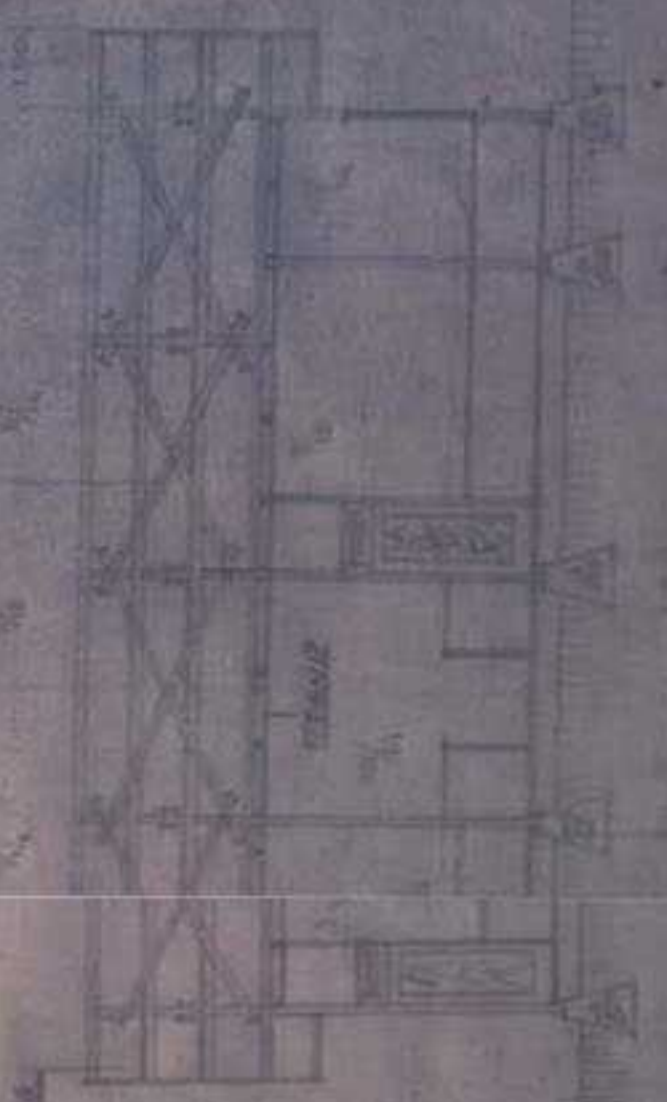

POTONGAN C



POTONGAN FF

Handwritten notes and a circular official stamp at the bottom of the page.



TAKSIOM, 11 SEPTEMBER 1971.

Honor : 5071 7-1971

Lampiran : 7x5 lembar. foto.

Perihal : Progress report/pisul foto  
atas pembangunan rumah sanex/  
Kantor Tjamat Kepala Pemerin-  
tahan Ketjamatan Hilin Nara.

K e z a d a  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

di

BAN DA ATJEH.

Dengan hormat.

Sesungguhnya dengan surat kami terdahulu tanggal 30 Agustus 1971  
No. 5074/V-1971, tentang hal tersebut pada pokok surat ini, maka untuk  
melengkapi progress pembangunan rumah sanex Kantor Tjamat Kepala Pe-  
merintahan Ketjamatan Hilin Nara, terlampir dikirimkan pada Saudara  
foto pisulaja untuk terjemah pertama, kedua dan ketiga, guna diketeh-  
ui serta dipergunakan seperlunya.

Kemudian pisul foto terjemah keempat, akan dikirimkan beser-  
ta progress terakir setelah bangunan selesai yang diharapkan akhir  
September 1971 yang akan datang.-



BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

BUNDAH SUPA



KERT. PERKULIAHAN KEJAJARAN BILIN NARA  
DI ANGKUP (KAB. ANJAN TERDAH).  
\*\*\*\*\*

1.



TANAH BAWAH TERPAK HENDIKAN  
BANGUNAN DILIHAT DARI  
ARAH SELATAN.

2.



DILIHAT DARI ARAH UTARA  
NANPAK DILINDAURAN, DESA ANGKUP.



3.



BANGUNAN RUMAH/KANTOR SEDANG DIBERUNJAKAN  
DILIHAT DARI DEPAN.-

4.



BANGUNAN DILIHAT DARI SAMPING KIRI.

5.



BANGUNAN DILIHAT DARI BELAKANG.-



6.



DILIHAT DARI HADAPAN.

7.



DILIHAT DARI SAMPING KIRI.

8.



DILIHAT DARI ARAH BELAKANG.



-BERITA ATJARA PERPANDJANGAN-  
-WAKTU PENJERAHAN RUMAH ANNEX-  
-KANTOR TJAMAT SILIH NARA KABUPATEN ATJEH TENGAH-

-----Pada hari ini, tanggal duapuluh Djuli 1900 tudjuh puluh satu,-----  
jang bertanda tangan dibawah ini:-----

-----1. MURDIN SUFIR-----  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, bertindak atas nama-----  
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, selandjutnja-----  
disebut Pihak Pertama,

-----2. TKG. ABDUL DJALIL-----  
Direktur PT. Atjeh Tengah dengan akta Notaris Mangaradja Perlindungan-----  
tgl. 28 Nopember 1949, dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk-----  
PT. tersebut selaku pemborong, selandjutnja disebut Pihak Kedua,-----

-----1. Bahwasanja antara Pihak I dan Pihak II, telah terdapat persetu-----  
djuan untuk merubah maksud surat perdjandjian borongan Rumah Annex/--  
Kantor Tjamat Silih Nara, Nomor. 001/V-1971, Pasal dua, dimana dise-----  
butkan, bahwa se-lambatnja tgl. 22 Djuli 1971, pekerdjaan membangun-----  
gedung tsb. sudah diselesaikan, oleh beberapa hal terpaksa ditunda-----  
dan waktu penjelesaiannya diperpanjang mendjadi tgl. 30 September-----  
1971,-----

-----2. Perpandjangan waktu penjelesaian ini dapat disetujui, oleh-----  
karena alasan2 jang dikemukakan Pihak Kedua dalam suratnja No. 296/-i-----  
W/25 tgl. 15 Djuli 1971 dapat diterima sepemuhnja, jaitu disebabkan:--

-----a. Setelah surat perdjandjian borongan ditanda-tangani tgl. 22-2-----  
1971, jang seharusnya sedjak waktu itu pekerdjaan telah dimulai,-----  
tetapi kenyataan bahwa pelaksanaannya dimulai terlambat 2 bulan,-----  
oleh karena dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Tengah se-----  
dang dalam proses penjelesaian tanah tempat dimana gedung tersebut--  
harus dibangun,-----

-----b. Setelah proses penjelesaian tanah tersebut selesai, maka pada-----  
tgl. 15 April 1971, pekerdjaan baru dapat dimulai jang diharapkan-----  
akhir September 1971, sudah dapat diselesaikan,-----

-----Demikianlah berita atjara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk-----  
dapat dipergunakan seperlunya.-----

-----0000-----

Takengon, 20 Djuli 1971.-

Pihak Kedua;  
PEMBORONG,

(TKG. ABD. DJALIL).

Pihak Pertama;

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

(MURDIN SUFIR).

MENGETAHUI :  
Pimpinan Proyek Pembangu-  
nan Kantor Tjamatan

(Drs. Kuswandi)





No.  
M.A.  
Tahun

A x 11  
Kedua  
Ketiga  
Keempat

Mengotahui  
Pimpinan Proyek Pembangunan Kantor Ketjamatan  
**TANDA PENERIMAAN**

Drs. Kasnan - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.-

LIANG BANYAKNYA = LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU SEPULUH RATUS TUJUH RIBU  
RUPIAH LIMA PULUH SEMBILAN.

YAITU

Uang pembayaran termuka Kedua dari harga borongan Pembangunan Kantor/  
rumah annex Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Silih Har, Angkup,  
(sesuai menurut surat perundangan borongan tgl. 25 Maret 1971 No. 2/V-  
1971 ( 2% x Rp 2.315.670,- ).-

TAKENGON, 17 M E I 1971.-

Jang meneminta

~~JAIEN TENGAH~~

TANDA

**TKR. ABD. DJALIL**  
Direktur P.T. Atjeh  
Tengah TAKENGON.-

Nama  
Pekerdjaan  
Alamat (ang terang

Pembayaran dietudus)  
RENDIAHARAWAN

TERBILANG Rp. **578.917,50**

Barang/pekerdjaan yang dimaksud telah di  
terima/diselektengarsakan dengan sempurna.

Pada tanggal 19

Pengurus Barang/pekerdjaan



SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. : 291/PO/BAP/ VI -71.-

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Djuni 71, telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita Nasional :

Nama proyek : Penyelesaian Prasarana Fisik Pasonggradja.-  
Nomor kode : 3112.007.042.06.-  
Departemen/Lembaga : Pemerintah Daerah.-  
Lokasi : Ktj, Silih Nara Kabupaten Atjeh Tengah.-  
Pimpinan Proyek : Drs. Koedwandi.-  
Bendaharawan Proyek : Said Abdullah.-

yang dilakukan oleh : 1. Drs. Abbas Abdullah, Wakil Kepala II SPOP.-  
2. Ir. Inan A. Rahman, Staf Teknis SPOP.-

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

I. Bagian Pekerjaan : - Pembangunan Kantor / Rumah Annex, Tjamat Kepala Daerah  
Pemerintahan Kecamatan Silih Nara di Angkub Kabupaten  
Atjeh Tengah.-----

yang diborongan kepada :

----- PT. ATJEH TENGAH -----

dengan Surat Perdjandjian No. Dibawah Tangan No. 001/V/71 -----

tanggal 22 Februari 71

setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress Report  
tanggal 17 Mei 71 dan Inspeksi yang

No. -----

dilakukan pada tanggal -----

maka terdapat progress fisik sebesar

50 % ( Lima puluh perseratus ).--

II. Mengingat Surat Perdjandjian tersebut maka kepada Pendorong Proyek ini telah dapat disalurkan pembayaran termijn ke I, II ( satu, dua ) sebesar Rp. 1.157.835.-----  
( Satu djuta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima  
rupiah ).-----

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk sepelehan.

P E M E R I K S A :

1.

Abbas

2.

*[Signature]*



MENGETAHUI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
SEKRETARIAT DAERAH,

*[Signature]*  
-----  
MUHAMMAD HABAN BASRY

Adi Wira Djaksa Hrp. 66164



BANDA ATJEH, 3 Djuni 19 73

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

WAKIL KEPALA I,

*[Signature]*  
-----  
DRS. MUHAMMAD SAID

TEMBUSAN - dikirimkan kepada :

1. K.B.N./K.P.B.N. di : Banda Atjeh.
2. D.P.A.N. di : Banda Atjeh :
3. Departemen Dalam Negeri di : Djakarta.
4. Bupati/Walikota Kdb. : Kab. A. Tengah.
5. Pimpinan Proyek jbs :
6. Ferisinggal.



PROGRES - REPORT :

Tanggal : 17 Mei 1971. Nama Proyek : Pembangunan Kantor/rumah annex  
Kwartal : IV-1970/1971. : Tjamat Kepala Pemerintah Kotja-  
matan Silih Nara di Angkub.  
Propinsi : Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.  
Terletak : di - A n g k u b.-

Diberikan rangkap 10 : 1). Skisoutan 2). K.B.P.U. 3). Rng. Documentasi D.P.U.  
4)..... 5)..... 6).....

A. LAPORAN TEKNIK :

No.	Bahagian Pekerjaan :	Progress :	T j a t a n :
		%	
1.	Penjelidikan pertama	100	
2.	Penjelidikan lengkap	100	
3.	Rentjana gub. (Dadgn) Anggn. belandja	100	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan pembukaan (djalan masuk)	100	
6.	Heckset, gudang, pengukuran dab.)	100	
<u>Pelaksanaan bangunan :</u>			
7.	Pekerjaan tanah	100	
8.	Pekerjaan fondamen.	100	
9.	Pekerjaan batu/bata	50	
10.	Pekerjaan rangka (kuda2 + tiang2).	90	
11.	Pekerjaan rangka atap	60	
12.	Pekerjaan lantai	15	
13.	Pekerjaan pintu dan djenjala	-	Dikerdjakan di-Medan.
14.	P l a p o n	-	
15.	A t a p	-	
16.	B i n d i n g	70	
17.	T j a t	-	
18.	Dan lain - lain		

B. LAPORAN ADMINISTRASI :

Proyek disetujui pada tanggal : 25 - 3 - 1971.  
Anggaran belandja seluruhnja : Rp. 2.315.670.-

Djumlah : Rp. 2.315.670.-

Ditorisier tahun2 jang lalu : -.-

S i s a : Rp. 2.315.670.-

Otorisasi tahun 1971.

No.	Tanggal	Ditorisier :	Sian :	T j a t a n :
1.	-	Rp. -.-	2. -.-	Terutama ke I
2.	-	" -.-	" -.-	" ke II
3.	-	" -.-	" -.-	" ke III
4.	-	" -.-	" -.-	" ke IV

MEMORANDUM :

BUPATI/Kepala Daerah Kabupaten  
ATJEH TENGAH,

TAHONGG, 17 Mei 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
ATJEH TENGAH,

( BERDIA SUPLE )





LAPORAN TAHUNAN 1977/1978 PROJEK

A. Uraian singkat rencana pelaksanaan :

Pelebaran Kantor

(Lihat lampiran)

Proyek	Pelebaran Kantor/ruang	Uraian	Uraian
Bagian pekerjaan	Uraian pekerjaan	Uraian	Uraian
Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Uraian	Uraian	Uraian	Uraian

B. Revisi atau koreksi :

B. Penjelasan tentang surat pelaksanaan pekerjaan :

a. <u>Proyek diawali/pelebaran</u>	125-3-1977	Revisi pekerjaan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
b. <u>Revisi pelaksanaan</u>	1-4-1977	Revisi pekerjaan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
c. <u>Revisi rencana</u>	425-8-1977	Revisi pekerjaan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian

C. Pelebaran :

1. Pelebaran biaya

Rp. 2.315.670,-

2. a. Revisi biaya yang

telah diotorisasi 1970 "

b. Biaya yang telah

diotorisasi tahun 1971 "

Revisi :

a. Biaya yang telah diotorisasi

sempel akhir bulan April 1971

1971

b. Biaya yang telah diper-

gunakan sempel akhir

bulan April 1971

c. Biaya yang tersedia

Rp. ....

d. Biaya yang telah diper-

gunakan untuk 2 bulan

di atas

B. REVISI :

Yang merupakan akibat pelaksanaan pekerjaan :

REVISI :

Revisi Kepala Daerah Kabupaten

Atjeh Tengah,

REVISI SURTI

1. Nama

2. Jabat

3. Tempat tinggal

17 Mei 1977.

Mengakhiri :

Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Kantor Kecamatan



*[Signature]*



Lampiran Laporan berkemampuan Pembangunan/pelaksanaan rumah/kantor  
 Tjamat Kepala Pemerintahan Kabupaten  
 Silih Rara di Arjuna.

No.	Bagian pekerjaan menurut urut-jara anggaran bl.aja:	Jumlahnya pekerjaan jg ditrentja maksud	Pekerjaan jang telah selesai:	Pekerjaan da- lam bulan lapa- rus:	Djuaah jang telah diker- jakan	selesai dalam %	Keterangan:
1.	Pondok keraja.	1 buah	1 buah	-	1 buah	100	
2.	Gedong	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	-	150 m <sup>2</sup>	100	
3.	Terdaman parkir di bawah lantai.	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	-	50 m <sup>2</sup>	100	
4.	Panangan fundamen.	82 m <sup>2</sup>	82 m <sup>2</sup>	-	82 m <sup>2</sup>	100	
5.	Panangan batu bata.	200 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	50	
6.	Panangan lantai.	260 m <sup>2</sup>	-	260 m <sup>2</sup>	-	-	
7.	Plasteron.	490 m <sup>2</sup>	-	490 m <sup>2</sup>	-	-	
8.	Koson pintu djendela.	10,56 m <sup>2</sup>	10,56 m <sup>2</sup>	-	10,56 m <sup>2</sup>	100	
9.	Keraga kerdas-busa.	3,7 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	75	
10.	Kabung arisan (pentiluan).	21 bh	10 bh	11 bh.	10 bh	90	
11.	Praktek/djendela kati/panol/djalasi.	44 bh	-	-	-	-	
12.	Plaport.	203 m <sup>2</sup>	-	203 m <sup>2</sup>	-	-	
13.	Alonding papan.	326 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	166 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	50	
14.	Los plank.	80 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
15.	Kes dard tong.	331 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
16.	Dalangan atap.	96 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
17.	Tjot okran.	700 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
18.	Keraman.	700 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
19.	Merfjet.	700 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	



Mengetahui  
 BUDHATI KEMALA DAMARUS KABUPATEN  
 ARJUNA YUBIRTA,  
 (Tanda Tangan)



TARIFORON, 17 MEI 1971.  
 ARJUNA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 (Tanda Tangan)

Mengetahui  
 Pimpinan Proyek Pembangunan  
 Kantor Kewjaksanaan

(Tanda Tangan)



2705

.....

FORMULIR - B U R I T A

PANGHILAN : D A N I S     J R     D E D A D J A T     I N S T R U M E N T

D A R I : gub lmb prop daerah istimewa atjeh  
U N T U K : gub lmb lmb atjeh di tahanan

T E M B O S A N :

K L A S I F I K A S I :

H O N O R : 574/9-a tth sbb arda no 577/7-1971 lmb lmbp kiris negara  
lyta panitia bandar/lalang pembangunan bandar tjanet silih-  
sara lmb agar lmb dapat membaja tth lmb

gub atjeh

*By: D. S. F. H. not B. S. H. 7/12-71*

P E M B U A T :

Banda Atjeh, .....  
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPRIETAS  
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

*Subv. D. S. H.*

*[Signature]*  
S. HERNANDI HERNANDI  
Sek. D. S. H. No. 6610/...

D E S T I N A S I : P A R A T

.....





Kepada

GUNDAUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH  
DI

BANDA ACEH

No. 5291/V-1971.-

Lampiran : 1 x 10 lbr.

Perihal : Perubahan huruf pasal 2 (dua)  
surat perundangan borongan  
Kantor Tjamat Kepala Pemerin-  
tahan Ketsjamatan Gilih Nara.-

Dengan hormat, berlampiran dengan ini dikirimkan pada Saudara 1 x 10 lembar perubahan huruf pasal 2 (dua) surat perundangan borongan atas Kantor/Tamuh annex Tjamat Kepala Pemerintahan Ketsjamatan Gilih Nara di Angkop, dimana didalam perundangan tersebut seharusnya bangunan itu telah harus selesai dan tingginya teratas pada tanggal 22 Djuli 1971 sl.

Tetapi kelambatan tersebut bukanlah akibat suatu kesalahan pemborong tetapi akibat proses penyelesaian tanah yang harus dibeli sebagai yang telah pernah kami kemukakan pada Saudara dengan surat kami tgl. 23 Februari 1971, No. 6671/V-1971 sl.

Kemudian setelah 2 (dua) bulan surat perundangan dianda tanggal seharusnya penyelesaian tanah dapat dirampungkan dan sedjak itulah bakara pihak pemborong dapat memulai pekerjaannya.-

Disamping itu perlu kami laporkan bahwa mengenai pemborongan Kantor tersebut belum ada tanda terbenaklasi oleh karena dikerjakan terus menerus dan dirampungkan selesai pada akhir bulan September 1971 yang akan datang.



BUPATI KEPALA DAERAH KA KABUPATEN  
ATJEH TUMBAH,  
SEKRETARIS DAERAH,

SAHABUD ISMADIE S.A.

Tembusan + lampiran;  
Disampaikan pada Pt. Atjeh Tumbuh  
di Takongan, sekabupaten dengan so-  
ratnya tgl. 15 Djuli 1971 No. 376/1/73  
untuk diinfkani.-

Handwritten signature and initials, including a large '3' and a checkmark-like mark.

Faint handwritten notes at the bottom left of the page.

A large handwritten checkmark or 'v' mark at the bottom right of the page.











4

1309

No. 1002/7-1971.-

TELEPON, 22 April 1971.-

Lampiran : 1 x 13 berkas.-  
Terhadap : Kantor pembantuan  
Kantor Armer/ruah  
Tjasaat Kepala Pesta-  
riatibah Kertjandah  
Wilih Jera.-

Daftar  
Kantor Kepala Daerah  
Jember  
Jember  
44  
1002/7-1971.-

MEMORANDUM

Dengan perihal

1. Dalam rangka pelaksanaan surat perintah tanggal 22 Maret 1971 No. 1002/7-1971 mengenai hal tersebut yang terdapat pada lampiran ini, maka berhubung dengan ini dikirimi kepada anda 1 x 13 berkas surat perintah yang terdapat pada lampiran ini. Adapun surat perintah tersebut adalah sebagai berikut: Surat perintah tanggal 22 Maret 1971 No. 1002/7-1971 mengenai hal tersebut yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini.
2. Untuk keperluan pelaksanaan surat perintah tersebut, maka berhubung dengan ini dikirimi kepada anda 1 x 13 berkas surat perintah yang terdapat pada lampiran ini. Adapun surat perintah tersebut adalah sebagai berikut: Surat perintah tanggal 22 Maret 1971 No. 1002/7-1971 mengenai hal tersebut yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini.
3. Dalam rangka pelaksanaan surat perintah tersebut, maka berhubung dengan ini dikirimi kepada anda 1 x 13 berkas surat perintah yang terdapat pada lampiran ini. Adapun surat perintah tersebut adalah sebagai berikut: Surat perintah tanggal 22 Maret 1971 No. 1002/7-1971 mengenai hal tersebut yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini. Dengan surat perintah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada lampiran ini.
4. Demikian surat perintah ini disampaikan kepada anda untuk dilaksanakan.



Handwritten signature and initials.

Handwritten checkmark.



*Surabaya* 9/

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH  
T A K E N G O N

Untuk : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Atjeh.  
D a r i : Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Tengah.  
Tanggal : 5 M a r e t 1971.

- I S I -

No.: 1538/V/1971.

Kawat sdr nomor 1041 a/9-a telah dilakukan pentenderan pada tgl 10 pebruari 1971 kmo djotuh pada pt atjeh tengah sedjumlah rp 2.565.670,- termasuk harga tanah ttik surat perdjandjangan berongan telah dikirim lihat surat kami tgl 23 pebruari 1971 no 6570/V/1971 dan harap dicetudjui ttkhbs

4/ An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



*J S.*  
\_\_\_\_\_  
( MAHMUD IBRAHIM D.A ).-



Setoran seperti ini adalah jang  
ke ..... dalam tahun 19.....

**SURAT TANDA  
SETORAN**  
No. ....

Lembar ke .....

Setoran seperti ini jang terachir telah  
dilakukan pada tanggal .....

Kepala Kas Negara

Kepala Kantorpos (pembantu) di

Taklongan.....

harap menerima uang sebesar

*Rp.*

~~2,315,67~~

(dengan huruf): ~~DUA RIBU TIGA RATUS LIMA BELAS 67/100 rupiah~~

jadi Uang setoran biaya material atas surat perijinan bangunan  
Kantor Tjant Kepala Pemerintahan Kabupaten Silih Nara sebesar 10/00 x Rp.  
2.315.670.- = Rp. 2.315.670.- Rp. 2.315.670.-

Kepala Pembakuan

Taklongan, 15 24 Feb. 1971


~~K. S. H. O. R. A. N. G~~

~~JATIH TELAH~~

~~(P. S. A. H. U. D. A. L. I. I.)~~

\*) Dibatas dan tanda-tangan si-penjetor.

Uang tersebut diatas telah diterima



475 9- 1192/9-A  
21-7-70

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH

-----

No. : 3454/V/1970.-

Takengon, 18 Djuli 1970.-

-----  
Lampiran: 1 (satu) berkas.-  
Perihal : Anggaran biaya untuk  
mendirikan Kantor/Ru-  
mah Tjamat Kepala Pe-  
merintahan Ketjamat-  
an Silih Nara.-  
-----

K e p a d a :  
Jth.Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh  
di-  
B a n d a A t j e h.-  
-----

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan hormat, berlampirkan dikirimkan satu berkas Ren-  
tjana Anggaran Biaya untuk mendirikan Kantor/Rumah Tjamat Kapa-  
la Pemerintahan Ketjamatan Silih Nara berikut blue print-nja,  
dengan harapan agar mendapat persetujuan Saudara.

Demikianlah agar Saudara maklumi dan akan hasilnya ha-  
rap sedikit cebar dan terima kasih.-



BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH

== NURDIN SUPRIE ==  
-----

✓



D I S A S P E K E R D J A A U M U M K A B U P A T E N  
A T J E H T E N G A H

---

D a e r a h : Kabupaten Atjeh Tengah  
T e m p a t : T a k e n g o n . Pekerdjaan Baru.

L a m p i r a n :

Gambar.

Daftar Analisa.

Harga Upah + bahan

Tahun Ditan 19.....

~~Note~~ Pendjelasan.

ANGGARAN BIAJA UNTUK :

Mendirikan Kantor/Rumah Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan  
"semi Permanen di Daerah Kabupaten Atjeh Tengah dengan biaya se-  
besar Rp.2.308.657,34 ( DUA DJUTA TIGA RATUS DELAPAN RIBU ENAM  
RATUS LIMA PULUH TUJUH 34/100 RUPIAH ).-----

Pendjelasan ringkas tentang pekerdjaan yang  
akan diselesaikan :

1. Pekerdjaan Tanak.
2. Pekerdjaan Batu.
3. Pekerdjaan Kayu.
4. Pekerdjaan Mengatap.
5. Pekerdjaan Mengetjat/mengapur.
6. Pekerdjaan Lain-lain.

Untuk lebih djelasnja dipersilakan agar saudara meselanj akan  
isi anggaran ini beserta gambar.-----

-----oOoOo-----



Djumlah : U r a i a n	Djumlah uang untuk upah	Djumlah uang untuk bahan	Djumlah uang
150 M2			
<b>I. PEKERDJAAN TANAH.</b>			
25 %	Rp. 14.010.--	Rp. --	Rp. 14.010.--
60 M3	Rp. 3.503.--	Rp. --	Rp. 3.503.--
	Rp. 2.244.--	Rp. 90.000.--	Rp. 92.244.--
Djumlah	Rp. 19.757.--	Rp. 90.000.--	Rp. 109.757.--
<b>II. PEKERDJAAN BATU.</b>			
55 M3	Rp. 36.151,50	Rp. 342,287.--	Rp. 378.438,50
20 M3	Rp. 16.433.--	Rp. 268.800.--	Rp. 285.233.--
200 M2	Rp. 22.800.--	Rp. 119.100.--	Rp. 141.900.--
250 M3	Rp. 18.597,50	Rp. 35.000.--	Rp. 53.597,50
Djumlah	Rp. 94.342.--	Rp. 745.187.--	Rp. 839.529.--
<b>III. PEKERDJAAN KAJU.</b>			
15 M3	Rp. 75.510.--	Rp. 181.500.--	Rp. 257.010.--
3 M3	Rp. 118.877,50	Rp. 41.340.--	Rp. 160.217,50
28 M2	Rp. 35.238.--	Rp. 19.180.--	Rp. 54.418.--
Djumlah	Rp. 229.625,50	Rp. 242.020.--	Rp. 471.645,50

Djumlah	Djumlah uang untuk upah	Djumlah uang untuk bahan	Djumlah uang
I. Pekerjaan tanah	Rp. 19.757.--	Rp. 90.000.--	Rp. 109.757.--
II. Pekerjaan Batu	Rp. 94.342.--	Rp. 745.187.--	Rp. 839.529.--
III. Pekerjaan Kayu	Rp. 321.370,40	Rp. 423.990.--	Rp. 745.360,40
IV. Pekerjaan Mengutap	Rp. 11.557.--	Rp. 82.696.--	Rp. 94.253.--
V. Pekerjaan Mengetjut/mengapur	Rp. 25.455.--	Rp. 76.425.--	Rp. 101.880.--
VI. Pekerjaan lain2	Rp. 96.500.--	Rp. 111.500.--	Rp. 208.000.--
Djumlah	Rp. 568.981,40	Rp. 1.529.798.--	Rp. 2.098.779,40
10 % biaya yang tidak diduga	Rp. ....	Rp. 209.877,94	Rp. 209.877,94
Djumlah	.....	Rp. 2.308.657,34	Rp. 2.308.657,34

DUA DJUTA TIGA RATUS DELAPAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH 34/1000 RUPIAH )

TAKENGONG 11 JULI 1970.

DISETODJUI OLEH :  
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH  
Y E R G A N



MURDIN SURIB

B A S J R A H



	Sambungannya dari sebelah	Rp 129.625,50	Rp 242.020.-	Rp 371.645,50
5 M2	Mengardjakan lobang2 angin upah Rp.5.203,56+bahan Rp. 1.070.--Rp.7.073 Anl.F.34	Rp. 78.054,90	Rp. 28.050.-	Rp.106.104,90
00 M2	Papan Ebonet upah Rp.63,40+ Rp.326,40 = Rp.389,80 Anl. Spl.VII)	Rp. 12.680.--	Rp. 65.280.-	Rp. 77.960.--
0 M2	Pintu djendela panel upah Rp.1.573,25+Rp.704=Rp.2.277, 25	Rp. 62.930.--	Rp. 28.160.--	Rp. 91.090.--
00 M2	Dinding papan upah Rp.170+ Rp.270 bahan = Rp.440 Anl. F37).	Rp. 34.000.--	Rp. 54.000.--	Rp. 88.000.--
4 M2	Lipalank upah Rp.17+Rp.270.- bahan = Rp. 440.- Anl.337)	Rp. 4.080.--	Rp. 6.480.--	Rp. 10.560.--
	Djumlah .....	Rp.321.370.--	Rp. 423.990.--	Rp.745.360.40

#### IV. PEKERDJAAN MENGAJAP.

45 M2	Mesutup atap seng upah Rp.46,30 + Rp.312 = Rp.358,20 Anl.H.6)	Rp. 11.319.--	Rp. 76.440.--	Rp. 87.759.--
4 M'	Mesutup bubungan atap seng upah Rp.7.--+Rp.184.-bahan Anl. B10)	Rp. 238.--	Rp. 6.256.-	Rp. 6.494.--
	Djumlah .....	Rp. 11.557.--	Rp. 82.696.--	Rp. 94.253.--

#### V. PEKERDJAAN MENGETJAT/MENGAPUR.

50 M2	Mengapur dinding batu itermit upah Rp.9.--+Rp. Rp.25 bahan = Rp.34.-- (Anl.G.33)	Rp. 4.050.--	Rp. 11.250.--	Rp. 15.300.--
00 M2	Mengetjet siram pasir lalu di-kapur dinding papan luar dalam upah Rp.79.--+ bahan Rp.171.-- Anl.K 25 )	Rp. 15.800.--	Rp. 34.200.--	Rp. 50.000.--
295 M2	Mengetjet lipalank,kosen dinding dalam pintu djendela panel upah Rp.19 + Rp.105 bahan= Rp.124.-- Anl. K 23.	Rp. 5.605.--	Rp. 30.985.--	Rp. 36.580.--
	Djumlah .....	Rp. 25.455.--	Rp. 76.425.--	Rp.101.880.--

#### VI. PEKERDJAAN LAIN-LAIN.

	Pengangkutan	Rp. 50.000.--	Rp. --	Rp. 50.000.--
	Pengawasan	Rp. 15.000.--	Rp. --	Rp. 15.000.--
	Djaga Malam	Rp. 7.500.--	Rp. --	Rp. 7.500.--
	Pemasangan Bowplank	Rp. 4.500.--	Rp. 8.000.--	Rp. 12.500.--
	Pondok kerdja	Rp. 15.000.--	Rp. 35.000.--	Rp. 50.000.--
	Adm, Progres Report dan lain2	Rp. --	Rp. 25.000.--	Rp.25.000.--
	Membeli kuatji esnel dll	Rp. --	Rp. 40.000.--	Rp. 40.000.--
	Djumlah .....	Rp. 96.900.--	Rp. 111.500.--	Rp.208.000.--



Daftar Analisa untuk mendirikan Kantor/Dwajah Tjamet Kapa-  
la Pemerintahan Ketjamtan Dalam Kabupaten Atjeh  
Tengah.-

Analisa : U r a i a n : Djumlah uang : Djumlah uang : Djumlah uang  
untuk upah : untuk bahan :

Anal. A.I Galian tanah.

0,75 pekerdja	a Rp.125.-	Rp. 93,75	--	Rp. 93,75
0,025 mandur	a Rp.150	Rp. 37,50	--	Rp. 37,50
Djumlah .....		Rp.131,25	--	Rp.131,25

Pasir timbuan.

Anal. A 18 1,2 M3 pasir uruk	a Rp.1.000.-	--	Rp. 1.200.-	Rp.1.200.-
0,3 pekerdja	a Rp.125.-	Rp.37,50	--	Rp. 37,50
0,01 mandur	a Rp.150.-	Rp. 1,50	--	Rp. 1,50
Djumlah .....		Rp.39.-	Rp. 1.200.-	Rp.1.239,50

Fondasi batu gusung Tjamp.1:4.

Anal.032h 1,2 M3 batu gusung	a Rp.1.000.-	--	Rp. 1.200.-	Rp.1.200.-
0,958 Tong semen	a Rp. 850.-	--	Rp. 813.-	Rp. 813.-
0,522 M3 pasir pas- angan	a Rp.1.0001-	--	Rp. 522.-	Rp. 522.-
1,2 Tukang batu	a Rp.125.-	Rp.150.-	--	Rp. 150.-
0,12 Kepala Tukang	a Rp.150.-	Rp.180.-	--	Rp 180.-
3,6 pekerdja	a Rp.125.-	Rp.450.-	--	Rp. 450.-
0,18 Mandur	a Rp.150.-	Rp. 27.-	--	Rp. 27.-
Djumlah .....		Rp. 707.-	Rp.2.535.-	Rp.2.342.-

Tembok batu merah tjamp.1:4.

Anal.033 450 buah batu bata	a Rp.25.-	Rp. --	Rp.6.750.-	Rp.6.750.-
0,045 tong semen	a Rp.850.-	Rp. --	Rp. 633,25	Rp. 633,25
0,406 pasir pasangane	Rp.1000.-	Rp. --	Rp. 406.-	Rp. 406.-
1,5 Tukang batu	a Rp.125.-	Rp. 187,50	--	Rp. 187,50
4,5 Pakerdja	a Rp.125.-	Rp. 562,50	--	Rp. 562,50
0,15 Kepala Tukang	a Rp.150.-	Rp. 22,50	--	Rp. 22,50
0,225 pekerdja mandura	Rp.180,-	Rp. 22,75	--	Rp. 22,75
Djumlah .....		Rp. 795,75	Rp.7.789,25	Rp.8.584,50

Lantai beton tjamp.1:3:6.

Anal.067 0,07 M3 krikil	a Rp.1000.-	Rp. --	Rp. 70.-	Rp. 70.-
0,044 M3 pasir pas- angan	a Rp.1000.-	Rp. --	Rp. 44.-	Rp. 44.-
0,107 Tong semen	a Rp. 850.-	Rp. --	Rp. 909,50	Rp. 909,50
0,125 Tukang batu	a Rp. 125.-	Rp. 156,25	Rp. --	Rp. 156,25
0,0125 Kepala tukang	a Rp. 150.-	Rp. 18,75	Rp. --	Rp. 18,75
0,72 pekerdja	a Rp.125.-	Rp. 90.-	Rp. --	Rp. 90.-
0,036 mandur	a Rp.150.-	Rp. 4,40	Rp. --	Rp. 4,40
Djumlah .....		Rp. 269,40	Rp.1.023,50	Rp.1.292,90

Felsteran Tjamp.Lt2.

Anal.050h 0,042 tong semen	a Rp.850.-	Rp. --	Rp. 35,50	Rp. 35,50.
0,0114 M3 pasir pas- angan	a Rp.1000.-	Rp. --	Rp. 11,40	Rp. 11,40
0,15 M3 tukang batu	Rp.125	Rp. 18,75	Rp. --	Rp. 18,75
0,015 Kepala tukang	Rp.150	Rp. 2,25	Rp. --	Rp. 2,25
0,4 pekerdja	a Rp.125.-	Rp. 5.-	Rp. --	Rp. 5.-
0,02 Mandur	a Rp.150.-	Rp. 3.-	Rp. --	Rp. 3.-
Djumlah .....		Rp. 29.-	Rp.47,10	Rp. 76,10.

Pekerdjnas Kuda2.

Anal.F22 24 Tukang kaju	a Rp.125.-	Rp.3.000.-	Rp. --	Rp.3.000 --
2,4 Kepala Tukang	a Rp.150.-	Rp. 360.-	Rp. --	Rp. 360.-
8 Pakerdja	a Rp.125.-	Rp.1.000.-	Rp. --	Rp.1.000.-



Panel : U r a i n : Djumlah uang : Djumlah uang : Djumlah uang  
 untuk upah : untuk bahan :

Djumlah dari halakan 1	Rp. 4.360.--	Rp. --	Rp. 4.360.--
0,4 mandur	a Rp.150.--	75.--	Rp. 75.--
Djumlah .....	Rp. 4.435.--	Rp. --	Rp. 4.435.--

Kosan?pintu/Djendela.

Anl. F 26	30 tukang kaju	a Rp.125	Rp.3.750.--	Rp. --	Rp. 3.750.--
	3 Kepala Tukang	a Rp.150	Rp. 450.--	Rp. --	Rp. 450.--
	10 pekerdja	a Rp.125	Rp.1.250.--	Rp. --	Rp. 1.250.--
	0,5 Mandur	a Rp.150	Rp. 75.--	Rp. --	Rp. 75.--
Djumlah .....		Rp.5.525.--	Rp. --	Rp. 5.525.--	

Pintu djendela Djalesi.

Anl. F34	9 Tukang kaju	a Rp.125	Rp.1.225.--	Rp. --	Rp. 1.125.--
	0,9 Kep.Tukang	a Rp.150	Rp. 135.--	Rp. --	Rp. 135.--
	3 Pekaraja	a Rp.125	Rp. 375.--	Rp. --	Rp. 375.--
	0,15 mandur	a Rp.150	Rp. 22,50	Rp. --	Rp. 22,50
	0,064 M3 kaju	a Rp.20.000.--	--	Rp. 1.280.--	Rp. 1.280.--
Djumlah .....		Rp. 2.657,50	Rp. 1.280.--	Rp. 2.93750	

Pintu/djendela/katja.

Anl. F36	6 Tukang kaju	a Rp.125	Rp. 750.--	Rp. --	Rp. 750.--
	0,6 Kepala tukang	a Rp.150	Rp. 9.--	Rp. --	Rp. 9.--
	2 pekerdja	a Rp.125	Rp. 250.--	Rp. --	Rp. 250.--
	0,1 Mandur	a Rp. 15	Rp. 15.--	Rp. --	Rp. 15.--
	0,035 M3 kaju	a Rp.20.000.--	30.--	Rp. 7000.--	Rp. 30.--700.--
	1 M2 katja	a Rp.1.000.--	--	Rp. 1.000.--	Rp.1.000.--
Djumlah .....		Rp. 1.024.--	Rp. 1.700.--	Rp.2.724.--	

Lipslank/langit2/dinding papan.

Anl. F37	0,8 Tukang kaju	a Rp.125.--	Rp. 100.--	Rp. --	Rp. 100.--
	0,08 Kep.tukang	a Rp.150.--	Rp. 12.--	Rp. --	Rp. 12.--
	0,28 Pkerja	a Rp.125.--	Rp. 35.--	Rp. --	Rp. 35.--
	0,014 mandur	a Rp.150.--	Rp. 2,10	Rp. --	Rp. 2,10
	0,2 Kg.paku	a Rp.150.--	Rp. 30.--	Rp. 30.--	Rp. 30.--
	1 M3 papan	a Rp.150.--	Rp. 150.--	Rp. 150.--	Rp. 150.--
Djumlah .....		Rp. 149,10	Rp. 180.--	Rp. 323,10	



Pasal : U r a i a : Djumlah uang : Djumlah uang : Djumlah uang  
 untuk bahan : untuk bahan

Reaksi atas rang.

Aml. F 19	0,1 Tukang kaju	a Rp.125.--	Rp.	12,50	--	Rp.	12,50	
	0,01 Kepala Tukang	Rp.150.--	Rp.	1,50	--	Rp.	1,50	
	0,15 Pekerdja	a Rp.125	Rp.	18,50	--	Rp.	18,50	
	0,0075 Mandur	a Rp.150.--	Rp.	9,75	--	Rp.	9,75	
	0,1 Kg.Pku	a Rp.130.--	Rp.	--	Rp.	13.--	Rp.	13.--
	1/90 M3 kaju	a Rp.20.000.--	Rp.	--	Rp.	1.800	Rp.	1.800.--
	Djumlah .....		Rp.	42,25	Rp.	1.813.--	Rp.	1.855,25

Mesutup atas seng-

Aml. H13	6 kaki seng	a Rp.400.--	Rp.	--	Rp.	2.400.--	Rp.	2.400.--
	4 buah scoop	a Rp. 10.--	Rp.	--	Rp.	40.--	Rp.	40.--
	0,2 Tukang kaju	a Rp.125.--	Rp.	25.--	Rp.	--	Rp.	25.--
	0,02 Kepala Tukang	Rp.150.--	Rp.	3.--	Rp.	--	Rp.	3.--
	0,1 pekerdja	a Rp.125.--	Rp.	12,50	Rp.	--	Rp.	12,50
	0,005 Mandur	a Rp.150.--	Rp.	1.--	Rp.	--	Rp.	1.--
	Djumlah .....		Rp.	41,50	Rp.	2.440.--	Rp.	2.481,50

Mesutup bubungan seng.

Aml. H 10.	5 Seng bubungan	a Rp.400.--		--	Rp.	2.000.--	Rp.	2.000.--
	12 sekruup + ring	a Rp. 10.--		--	Rp.	1.200.--	Rp.	1.200.--
	0,025 Kep.Tukang	a Rp.150.--	Rp.	3,75	Rp.	--	Rp.	3,75
	0,25 Pekerdja	a Rp.125.--	Rp.	31,25	Rp.	--	Rp.	31,25
	Djumlah .....		Rp.	35,--	Rp.	3.200.--	Rp.	3.235,00
	1 M' bubungan seng 1/10x3.235							323,50
	Djumlah .....							Rp.3.558,50
	dibulatkan menjadi.....							Rp.3.559.--

Kapuram.

Aml. G 53.	100 M2 mengapur							
	0,1 M3 kapur	a Rp.25.--	Rp.	--	Rp.	2,50	Rp.	2,50
	1 Tukang batu	a Rp.125.--	Rp.	125.--	Rp.	--	Rp.	125.--
	0,1 Kep.Tukang	a Rp.150.--	Rp.	15.--	Rp.	--	Rp.	15.--
	6 Pekerdja	a Rp.125.--	Rp.	750.--	Rp.	--	Rp.	750.--
	Djumlah .....		Rp.	890.--	Rp.	2,50	Rp.	892,50
	1 M2 kapuram 1/100	aRp.892,50						8,93
	Djumlah .....							Rp. 901,43
	dibulatkan .....							Rp. 900.--

Mengetjat.

Aml. Spl IX	10 M2 mengetjat.							
	1,42 Kg Tjat	a Rp. 250.--		--	Rp.	355.--	Rp.	355.--
	2,84 Kg taji warna	a Rp.250.--		--	Rp.	710.--	Rp.	710.--
	2,25 Tukang tjat	a Rp. 125.--	Rp.	281,25		--	Rp.	281,25
∠ Kep.tukang	0,225 Pekerdja	a Rp.150.--	Rp.	33,75	Rp.	--	Rp.	33,75
	1,5 Pekerdja	a Rp.125.--	Rp.	187,50		--	Rp.	187,50
	0,075 Mandur	a Rp.150.--	Rp.	11,25		--	Rp.	11,25
	Djumlah .....		Rp.	513,65	Rp.	1.065.--	Rp.	1.578,65
	1 M2 mengetjat 1/10	a Rp.1.578,65						Rp. 157,86
	Djumlah .....							Rp.1.736,51
	Dibulatkan menjadi.....							Rp.1.737.--



Keuangan, 11 Djuli 1970.-  
 Disang Pekarjasa Umum Kab.Atjeh



Pendjelasan

Marga

A. Upah pekerja bangsa Indonesia sehari :

Pekerdja	Rp. 200,-
" Kepala	Rp. 350,-
Mandor	Rp. 300,-
" Kepala	Rp. 375,-
Tukang Kayu	Rp. 250,-
Tukang Kayu Kepala	Rp. 375,-
Tukang Besi	Rp. 250,-
Tukang Besi Kepala	Rp. 375,-
Tukang Batu	Rp. 250,-
Tukang Batu Kepala	Rp. 375,-
Tukang Tjat	Rp. 250,-
Tukang Tjat Kepala	Rp. 375,-
Tukang Gergadji	Rp. 250,-
Tukang Soder	Rp. 250,-
Pengajam Besi Beton	Rp. 250,-
Pemasak Aspal	Rp. 250,-
Pemetjah Batu	Rp. 250,-
Supir Beridjazah A	Rp. 250,-
Supir Beridjazah B 1	Rp. 350,-
Supir Beridjazah B 11	Rp. 375,-
Masisis Stoom Walk	Rp. 375,-
Masisis Motor Walk	Rp. 250,-
Kesek Masisis Stikar	Rp. 250,-
Djaga Malam	Rp. 250,-

B. Harga Bahan :

1 M3 Kayu Medang Djeopa	Rp. 20.000,-
1 M3 Kayu Bekab	Rp. 20.000,-
1 M3 Kayu Benzag	Rp. 25.000,-
1 M3 Kayu Bulat	Rp. 20.000,-
1 M3 Kayu api	Rp. 800,-
1 M3 Kayu hutan bulat	Rp. 18.000,-
1 M3 Kayu hutan bekab	Rp. 18.000,-
1 M3 Kayu hutan benzag	Rp. 18.000,-
1-M3-	
10 batang bambu betung	Rp. 1.000,-
100 batang bambu biasa	Rp. 1.500,-
1 M3 Pasir urug	Rp. 1.500,-
1 M3 Pasir pasang	Rp. 1.500,-
1 M3 Batu kali	Rp. 1.500,-
1 M3 Batu petjak	Rp. 1.500,-
1 M3 Batu kerikil	Rp. 1.500,-
1 M3 Batu bubuk	Rp. 1.200,-
1 M3 Kapur	Rp. 25.000,-
1 M3 Gamping	Rp. 28.000,-
1 M3 semen merah	Rp. 25.000,-
1 Zak semen putih	Rp. 1250,-
1.000 Kg Aspal	Rp. 50.000,-
1.000 KG aspal RC2	Rp. 50.000,-
1.000 Kg Aspal beton	Rp. 50.000,-
1 liter minyak pluk	Rp. 200,-
1.000 Kg Residu	Rp. 40.000,-
1.000 bidji batu merah	Rp. 25.000,-
1.000 bidji gentang	Rp. 25.000,-
1.000 bidji gentangbubungan	Rp. 25.000,-
1 Kg paku	Rp. 150,-
1 M2 Pipa lidang	Rp. 150,-
1 Kg Besi beton	Rp. 150,-
1 Kg kawat pengikat beton	Rp. 200,-

Marga barang2 mukamas ..... 2 -



C. Harga Barang2 Makanan.

1 Kg. beras	Rp. 65.-
1 Kg. aram	Rp. 30.-
1 Kg. kacang	Rp. 150.-
1 butir telur itik segar	Rp. 15.-
1 Kg daging sapi	Rp. 250.-
1 Kg daging kerbau	Rp. 250.-
1 M2-katja	

Harga bahan2 samb.hal.l.

1 M2 Katja	Rp.1.000.-
1 Vout atap seng No.28	Rp.300.-
1 Vout atap seng hubungan	Rp.400.-
1 Kg Tjat	Rp. 500.-
1 Kg Tjat merah	Rp. 500.-
1 buah paku seng	Rp. 10.-

Takengon, 11 Juli 1970.-

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Atjeh Tengah,



*[Handwritten signature]*  
S J R A H
